



winkelsteeg

Informatiebijeenkomst

Ontwerp stationsomgeving Goffert

Planning infrastructuur

28 november 2024



winkelsteeg

Wat kunt u vanavond verwachten?



Wat gebeurt er rondom station Goffert en hoe komt het gebied eruit te zien?

Wat verandert er bij wegen en fietspaden in Winkelsteeg?


Inhoud presentatie

- Introductie
- Winkelsteeg tot nu toe
- Werken aan de weg: Planning & Fasering
- Ontwerp stationsomgeving Goffert
- Ontmoeten in Winkelsteeg
- Vragen
- Hoe blijft u op de hoogte?

Winkelsteeg tot nu toe

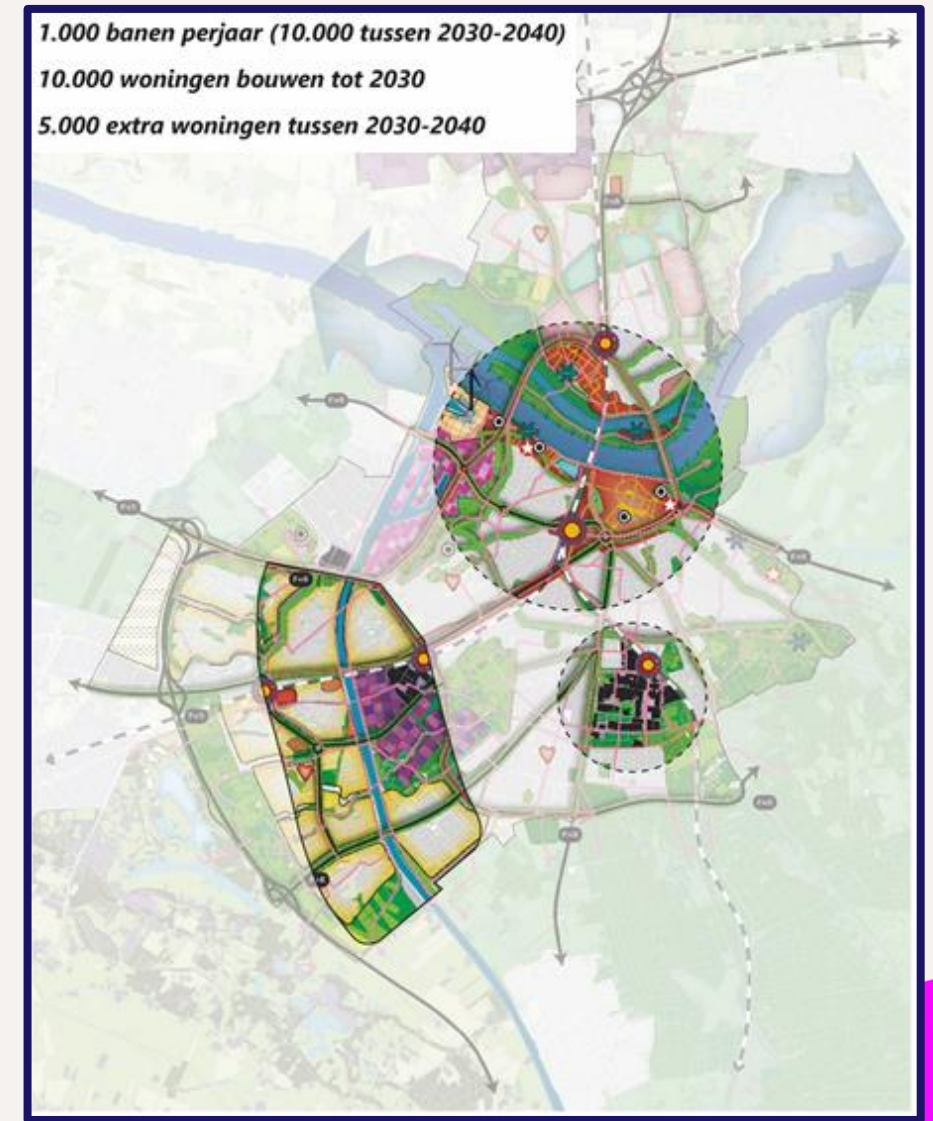

Winkelsteeg tot nu toe

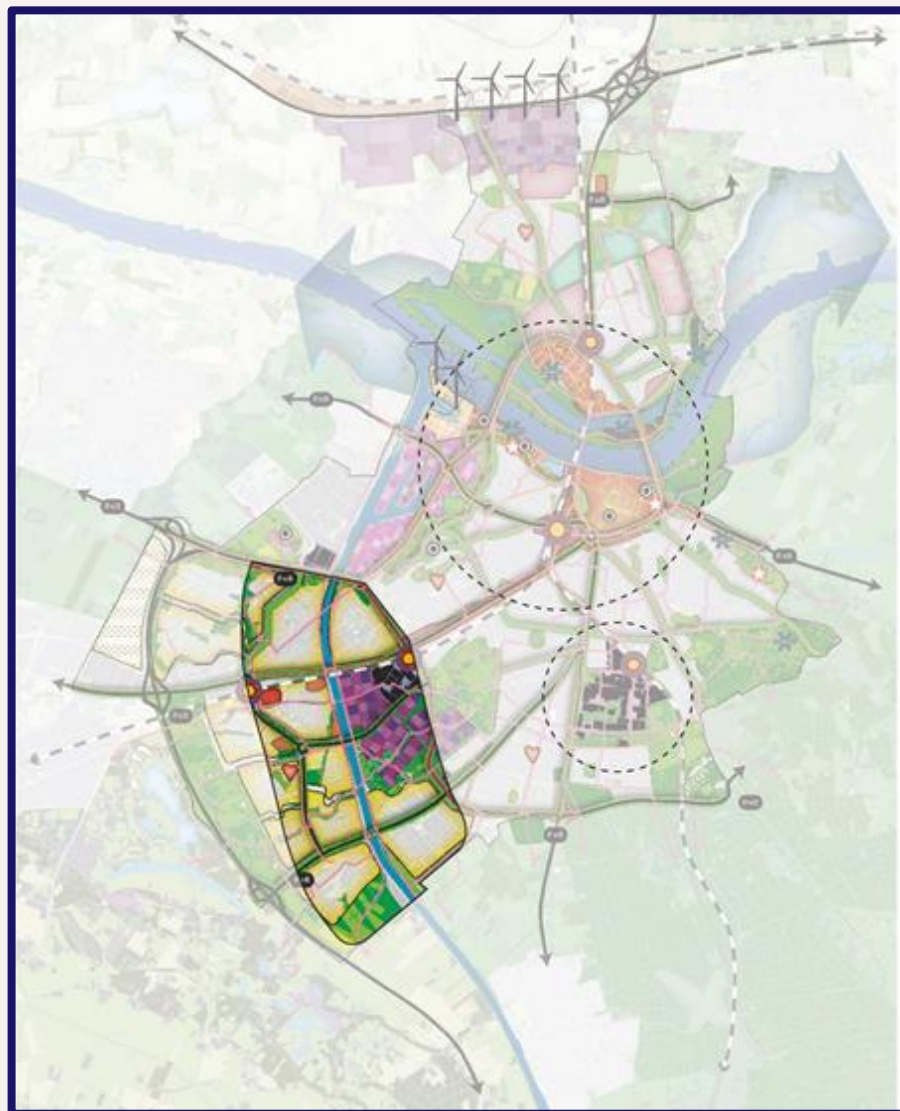

Winkelsteeg 2035

Ontwikkelvisie Winkelsteeg

Mei 2021

Winkelsteeg tot nu toe





winkelsteeg

Werken aan de weg


Door: Wouter Palm, Heijmans Infra

Voorstellen




Wouter Palm
Projectmanager Realisatie

Overzicht projectgebied

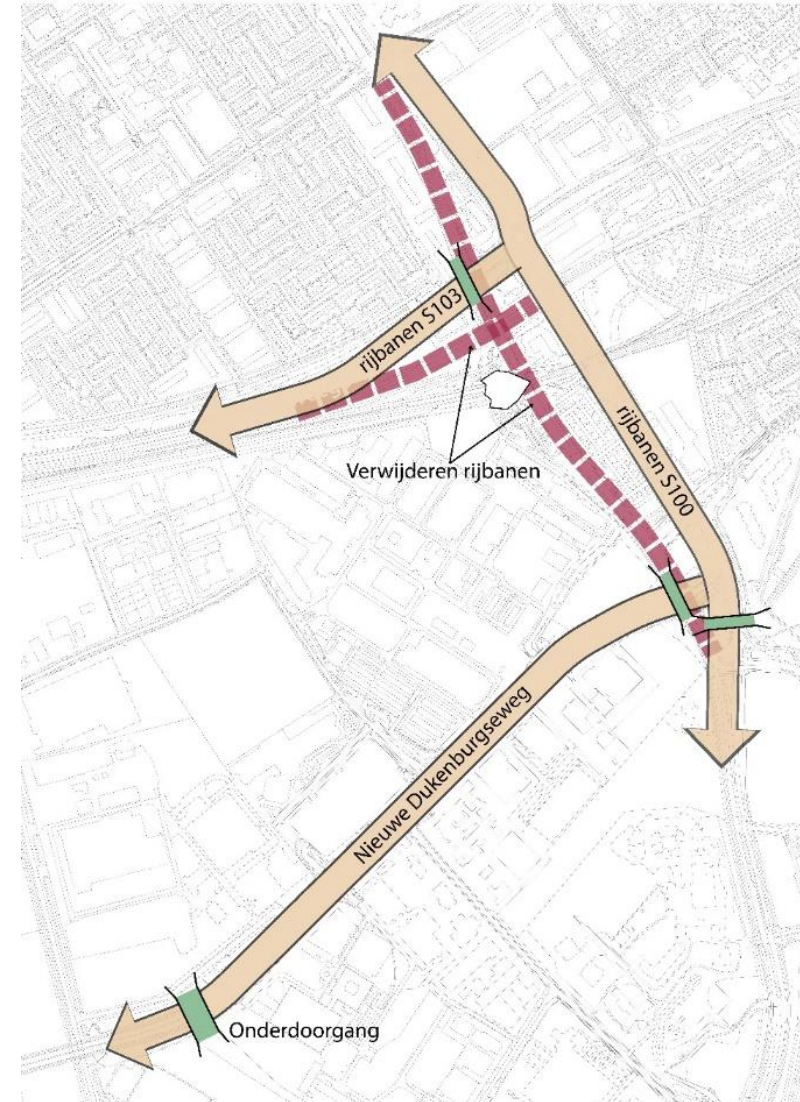

Fase 3

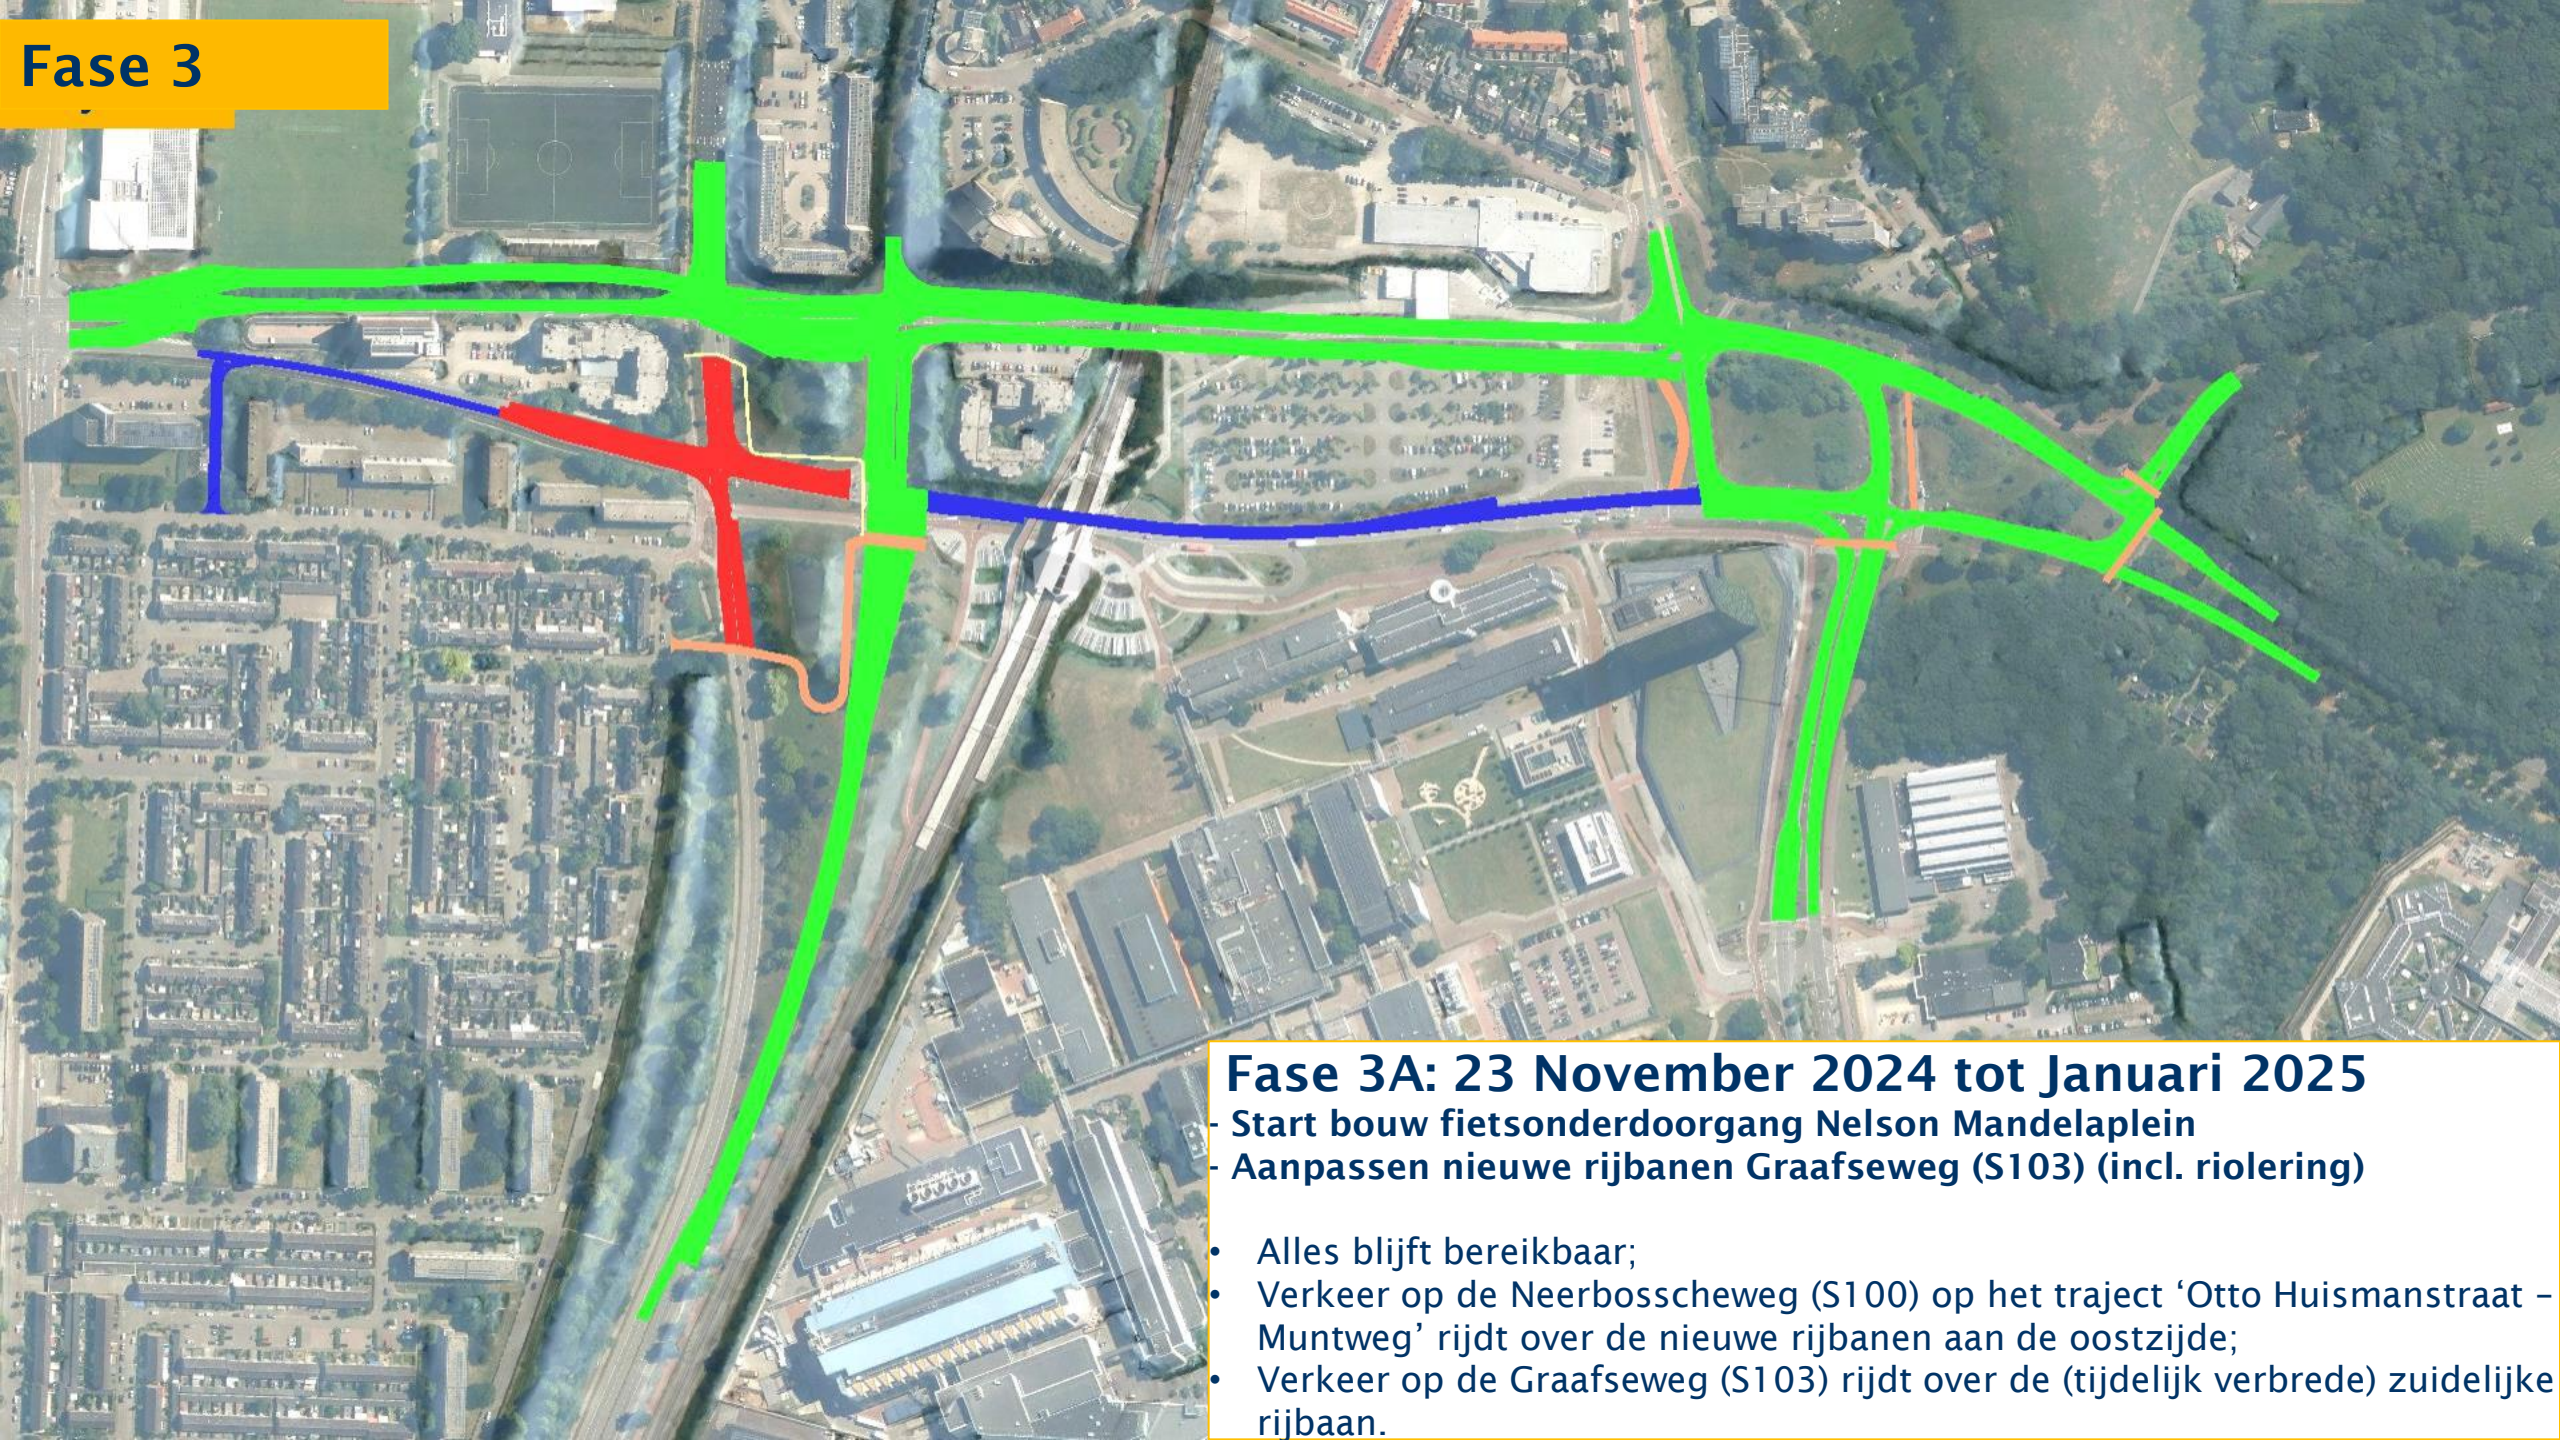


Fase 3A: 23 November 2024 tot Januari 2025

- Start bouw fietsonderdoorgang Nelson Mandelaplein
- Aanpassen nieuwe rijbanen Graafseweg (S103) (incl. riolering)


- Alles blijft bereikbaar;
- Verkeer op de Neerboscheweg (S100) op het traject 'Otto Huismanstraat - Muntweg' rijdt over de nieuwe rijbanen aan de oostzijde;
- Verkeer op de Graafseweg (S103) rijdt over de (tijdelijk verbrede) zuidelijke rijbaan.

Fietsonderdoorgang Nelson Mandelaplein

- Aanleg ondergrondse betonwand (CSM)
- Verleggingen K&L
- Aanpassen riolering
- Bouw fietsonderdoorgang

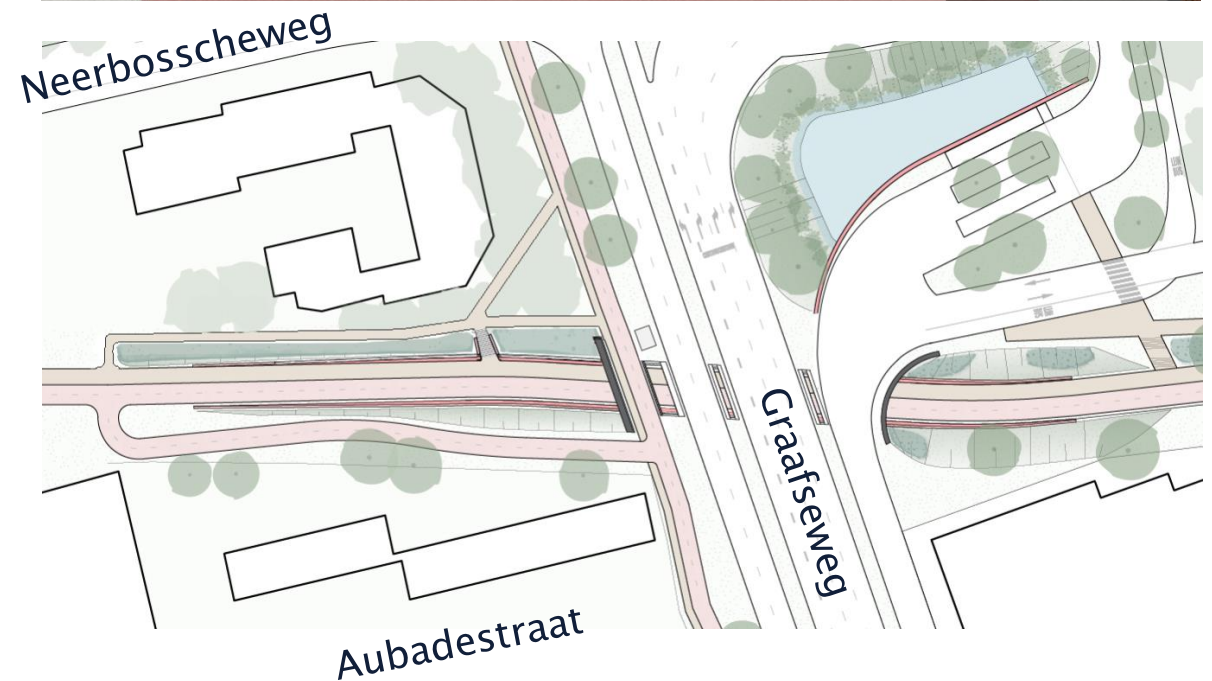


Fase 4

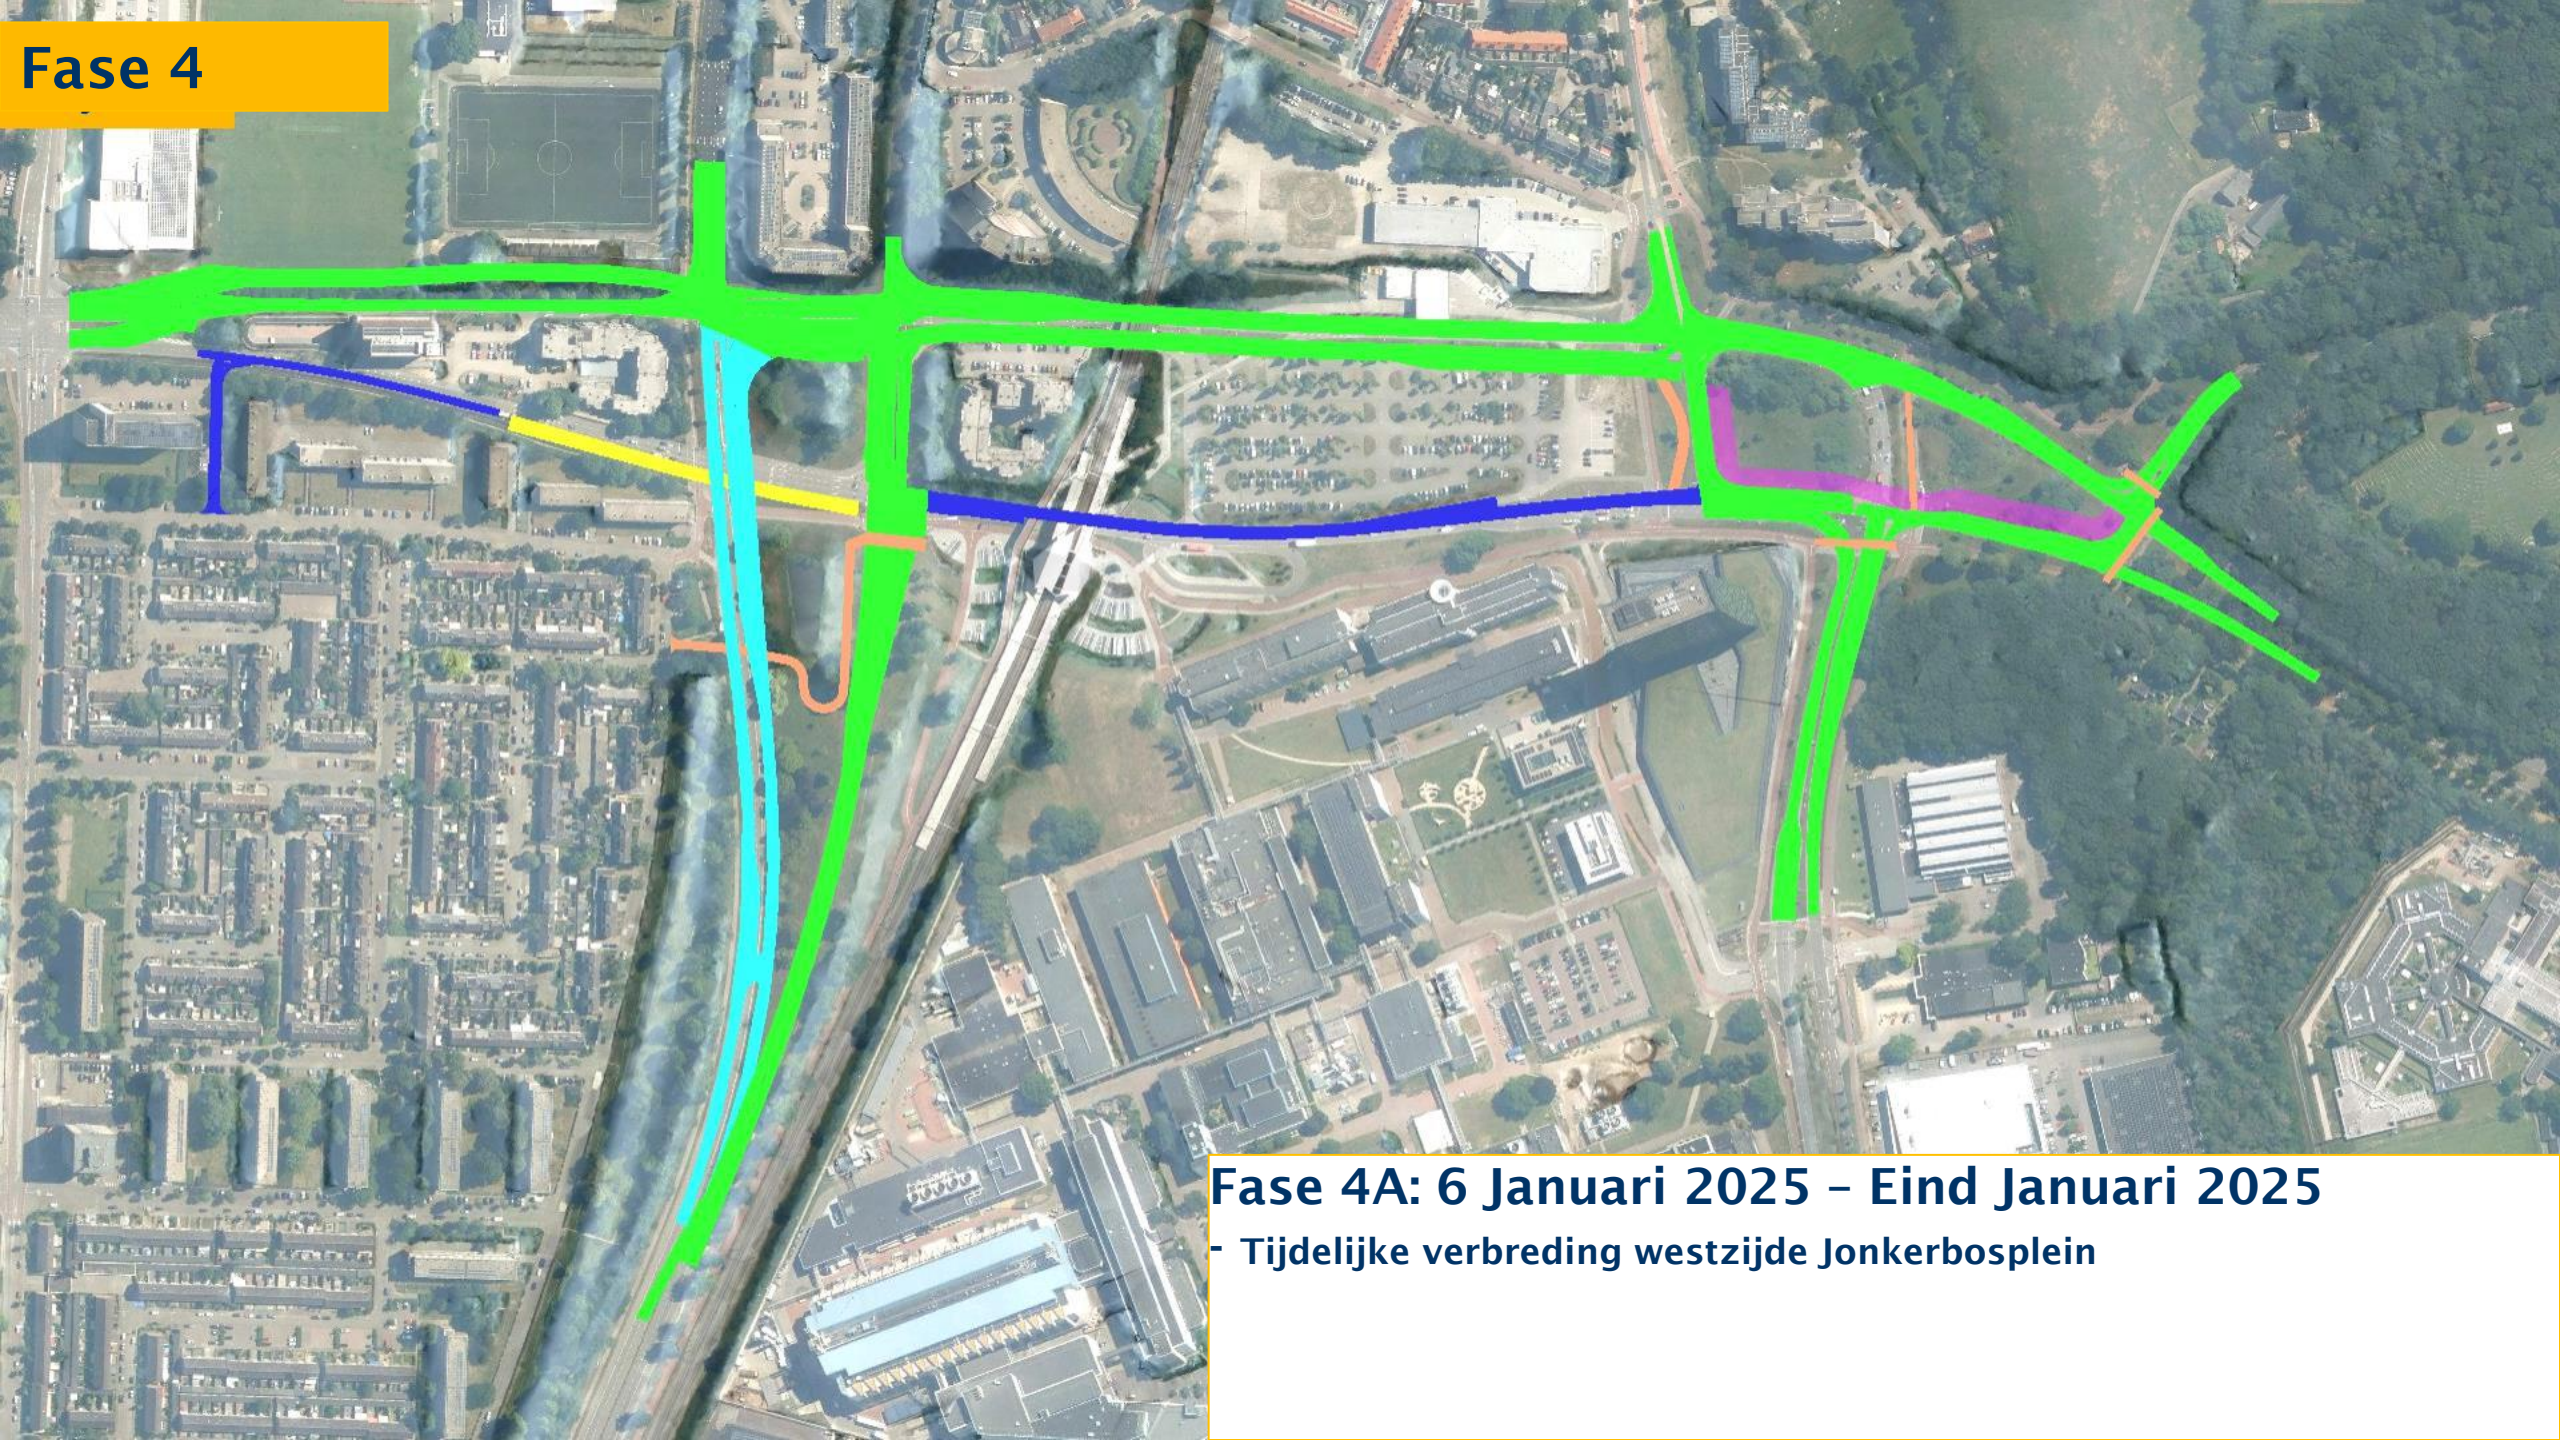

Fase 4A: 6 Januari 2025 – Eind Januari 2025
- Tijdelijke verbreding westzijde Jonkerbosplein

Fase 4

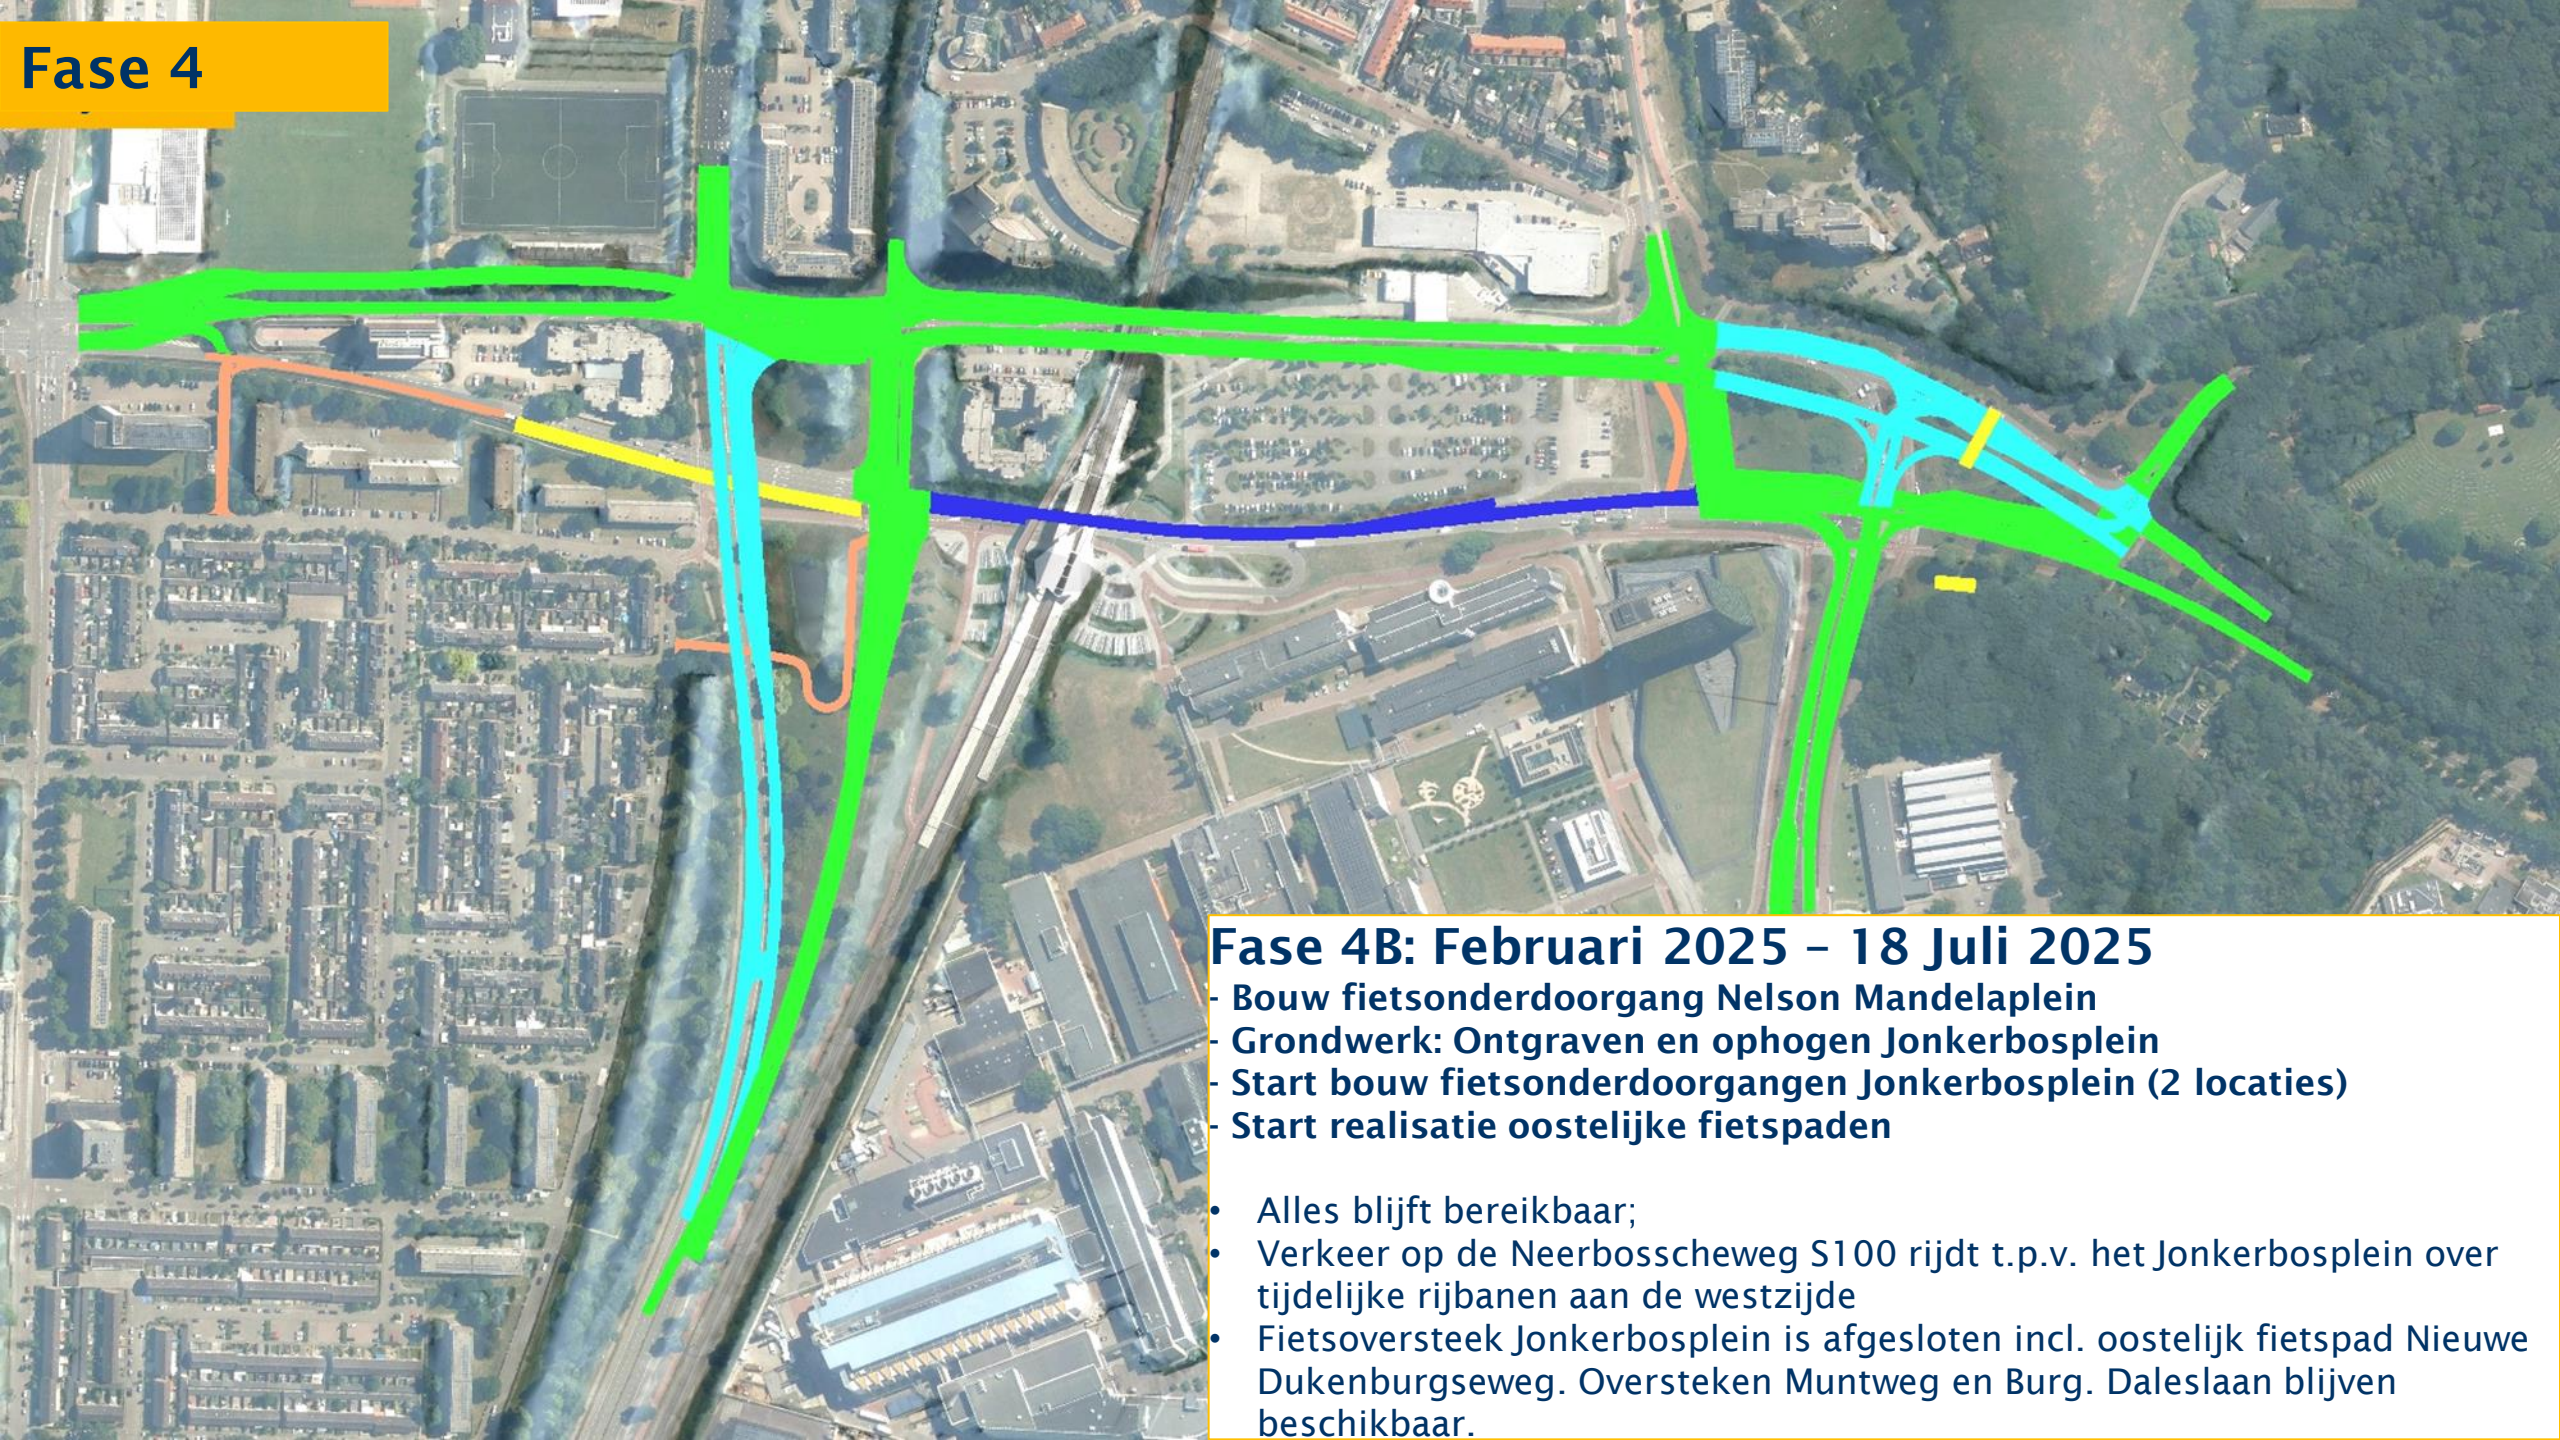

Fase 4B: Februari 2025 – 18 Juli 2025

- Bouw fietsonderdoorgang Nelson Mandelaplein
- Grondwerk: Ontgraven en ophogen Jonkerbosplein
- Start bouw fietsonderdoorgangen Jonkerbosplein (2 locaties)
- Start realisatie oostelijke fietspaden

- Alles blijft bereikbaar;
- Verkeer op de Neerboscheweg S100 rijdt t.p.v. het Jonkerbosplein over tijdelijke rijbanen aan de westzijde
- Fietsoversteek Jonkerbosplein is afgesloten incl. oostelijk fietspad Nieuwe Dukenburgseweg. Oversteken Muntweg en Burg. Daleslaan blijven beschikbaar.

Fase 4





Fase 4C: 19 Juli 2025 – 18 Augustus 2025 (4 weken na vierdaagse week).

- Afsluiting Nieuwe Dukenburgseweg (Aansluiting Halfgeleiderweg – Jonkerbosplein)
- Inrijden voorgebouwde onderdoorgang naar definitieve locatie
- Ophogen Nieuwe Dukenburgseweg + realisatie nieuwe rijbanen
- Doorgaand verkeer op de S100 blijft mogelijk. Bestemmingsverkeer Nieuwe Dukenburgseweg wordt omgeleid via Tarweweg

Fiets onderdoorgangen Jonkerbosplein

- Fietsverbinding blijft op bestaand niveau voor meer comfort. Rijbanen S100 / NDW worden verhoogd uitgevoerd;
- ‘Open’ ontwerp met doorzichten door de onderdoorgangen voor een prettig verblijfsklimaat

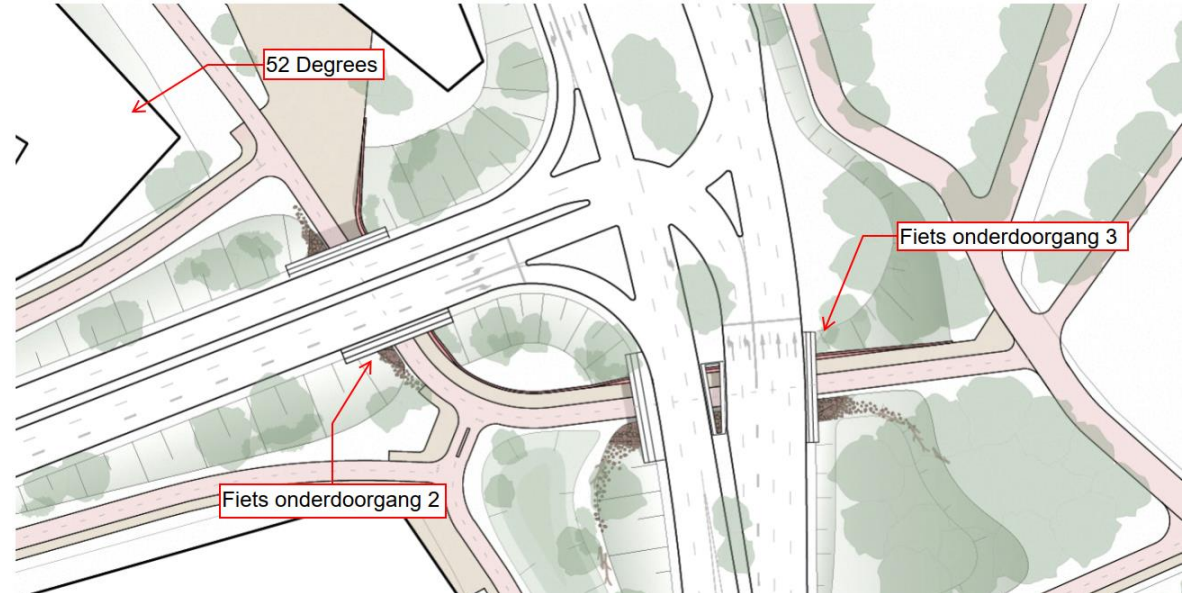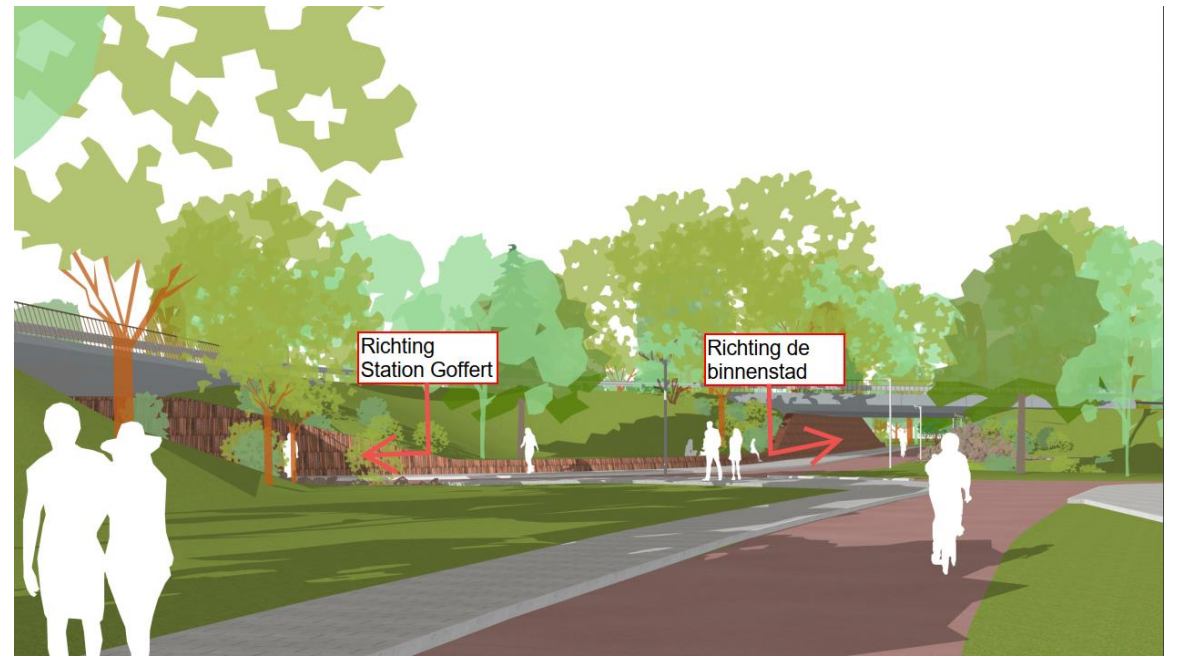


Fase 3



Fase 3B: Najaar 2025 – Eind 2025

- Ingebruikname nieuwe rijbanen Graafseweg (incl. brugdek fietsonderdoorgang)
- Ombouwen Nieuwe Dukenburgseweg (zie volgende sheet)
- Afbouwen fietsonderdoorgangen

Fase 3

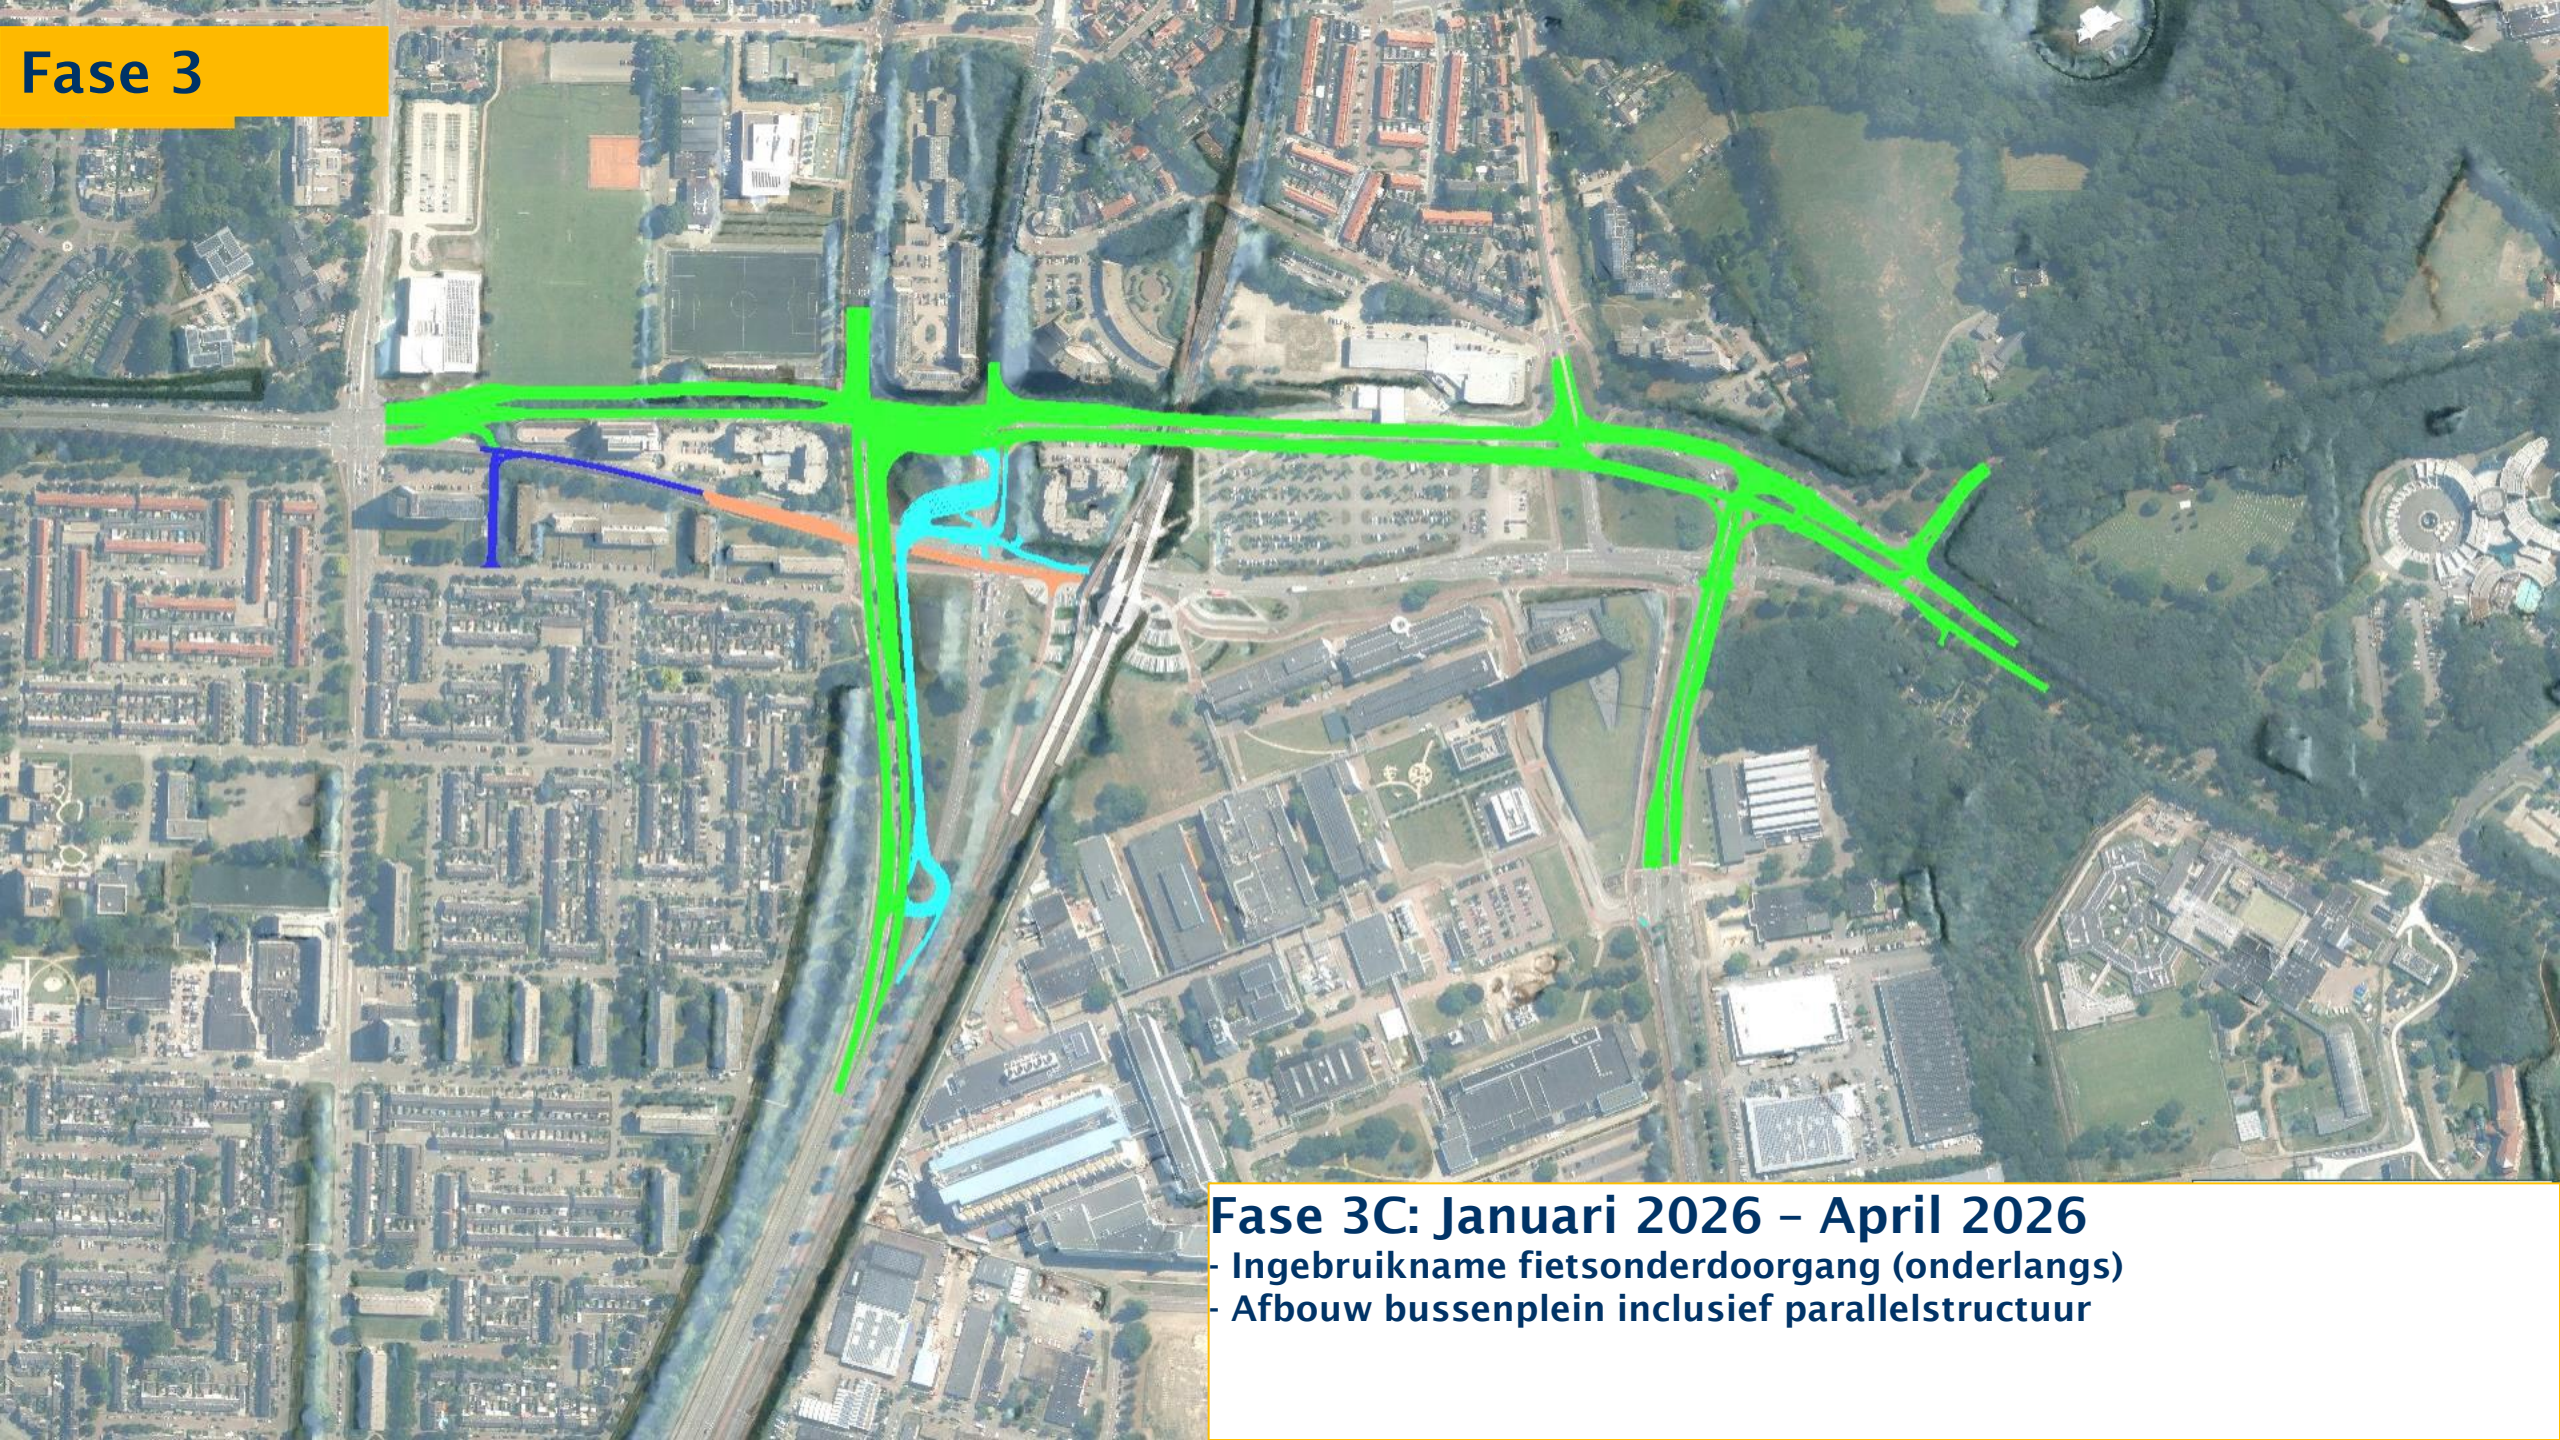

Fase 3C: Januari 2026 - April 2026
- Ingebruikname fietsonderdoorgang (onderlangs)
- Afbouw busseplein inclusief parallelstructuur

Fase 5

Bar Company

NXP Semiconductors
Netherlands BV

Winkelsteeg

Openluchttheater
de Goffert

Jan Messinkhal

Amslod Nijmegen |
Elektrische Fietsen
Tot 5 jaar garantie

Vallei Auto Groep |
Volkswagen | Škoda | Ni...
Audi, Volkswagen,
SEAT & ŠKODA

GOFFERT

Burgemees

Vossendijk

CWZ (Canisius)


Fase 5A: Najaar 2025 – Eind 2025

- Ombouwen Nieuwe Dukenburgseweg (zie volgende sheet)
- Inrijden voorgebouwde onderdoorgang

kenburgseweg

Voetregel Invoegen via menu Beeld > Koptekst of Voettekst

Fase 5 Nieuwe Dukenburgseweg

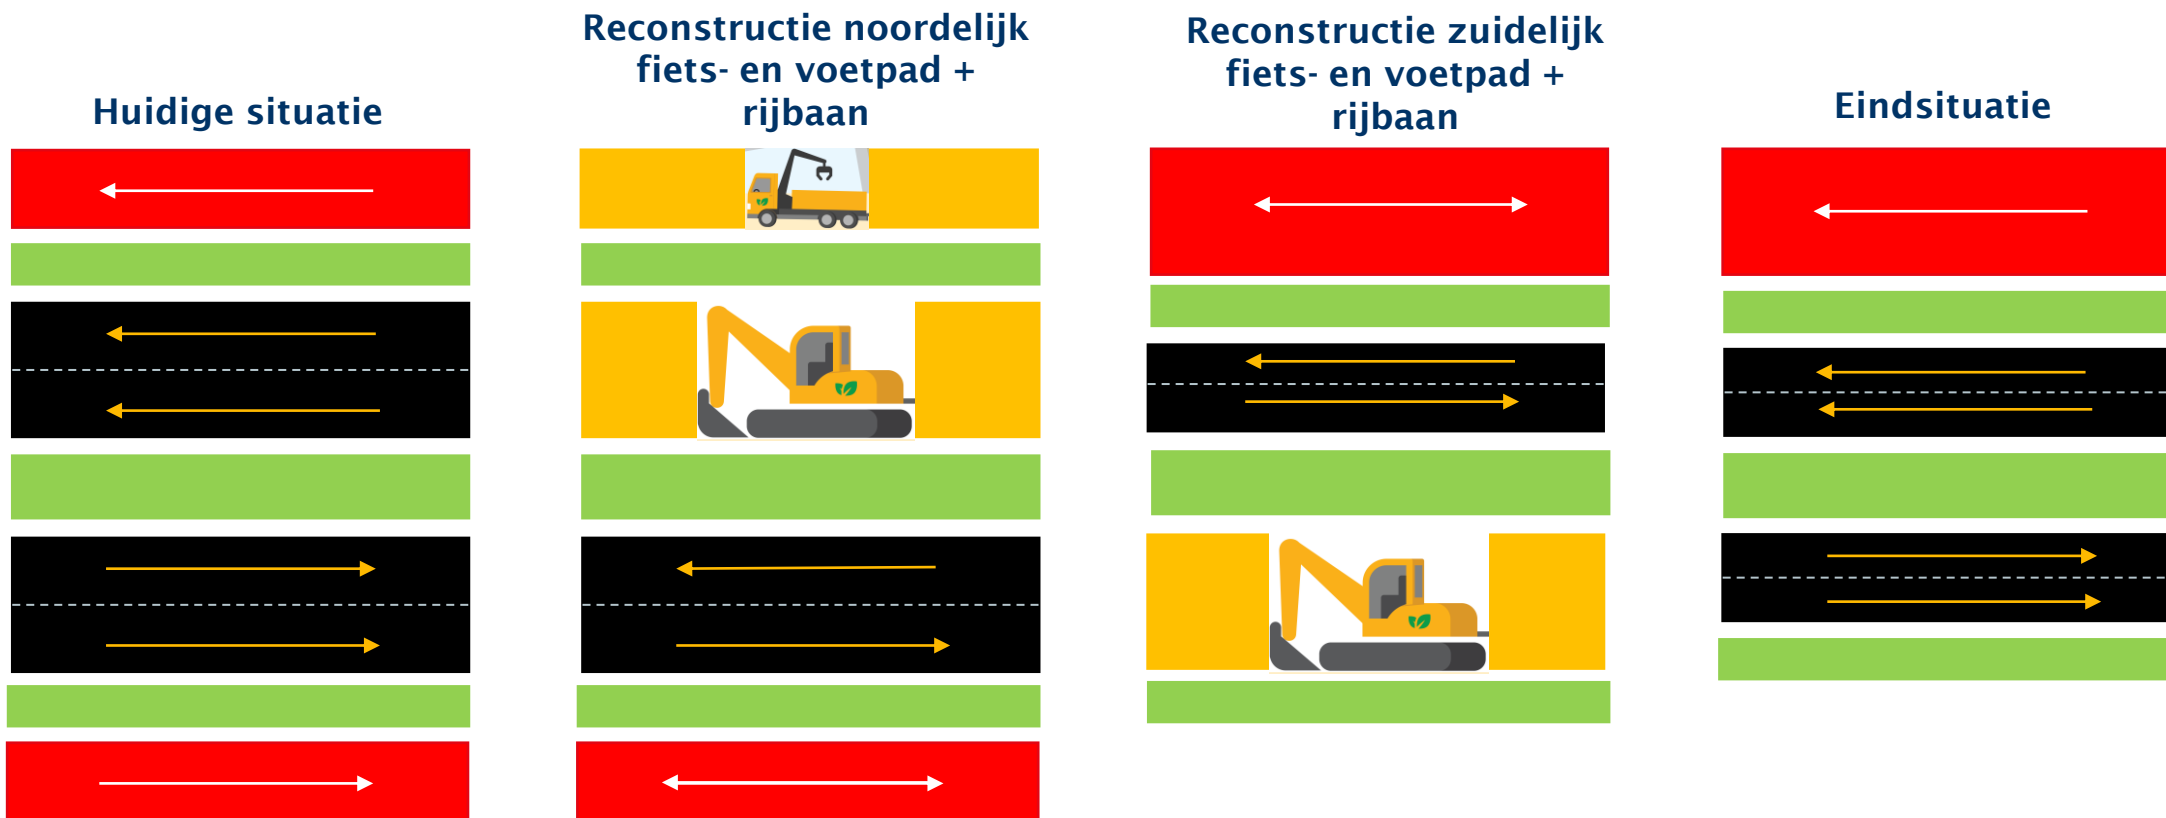

Fase 5: periode Najaar 2025 tot voorjaar 2026

Werkzaamheden: Nieuwe Dukenburgseweg aanpassen. Tijdens de werkzaamheden is steeds één kant van de weg bereikbaar voor het verkeer in beide richtingen. In de eindsituatie zijn de rijbanen smaller en de fietspaden breder.

- Alleen tijdens het asfalteren zijn mogelijk tijdelijke afsluitingen noodzakelijk.
- Er zijn naar verwachting enkele weekendafsluitingen benodigd.
- De omgeving is bereikbaar op smallere rijbanen en de reistijden kunnen langer zijn.

Fase 5



Fase 5B: Najaar 2025 (Circa 8 weken)

- Inrijden Fiets onderdoorgang + bijkomende werkzaamheden
- Aanpassen gasleiding

Communicatie over de werkzaamheden

- Voor vragen, informatie en feitjes over de werkzaamheden;
- Download de BouwApp;
- Volg het project “winkelsteeg hoofdinfrastructuur Nijmegen”.

Download de BouwApp



heijmans



Heijmans



HeijmansNV



Heijmansnl
