

# Bewonersavond

# ‘Reconstructie Quackplein & Burg. Hustinxstraat’

TOELICHTING ONTWERP & GEVOLGEN BEREIKBAARHEID



# Inhoudsopgave

---

## Willy Arends (Gemeente Nijmegen)

- Achtergrond project
- Toelichting ontwerp

## Wouter Palm (Heijmans)

- Planning & Fasering
- Toelichting bereikbaarheid gedurende bouwfase
  - › Verdere toelichting mogelijk bij informatietafels per locatie
- Vragen

RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

# Achtergrond project

---



RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

## Van juli 2017 tot nu

- **Maand – jaar** Presentatie voorontwerp aan omwonenden;
- Augustus 2017: Selectie aannemer Heijmans;
- Augustus – Oktober 2017: Uitwerken ontwerp in bouwteamverband;
- Oorspronkelijke planning: uitvoering november en december 2017
  - Planning opgeschoven i.v.m. inkomstenderving winkeliers tijdens de feestdagen (sinterklaas & kerst) & openstaande keuze fasering (bouwen in het verkeer of volledige afsluiting)
- Eind februari 2018: Keuze voor volledige afsluiting (raakvlak met VRI Singels)
- Zomer 2018: Informatieavond en start uitvoering na 4-daagse

RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

# Toelichting ontwerp

---

# Het ontwerp in hoofdlijnen

---

- Aanleiding is vervangen VRI Singels;
- Versmallen Quackplein en meer ruimte voor fietsers;
- Vergroening van het projectgebied;
- Burg. Hustinxstraat wordt heringericht als aantrekkelijke looproute van en naar het station/centrum;
- Materialisering komt overeen met van Schaeck Mathonsingel;
- Zitbank elementen met LED verlichting


# Details Quackplein

---



RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

# Details Burgemeester Hustinxstraat

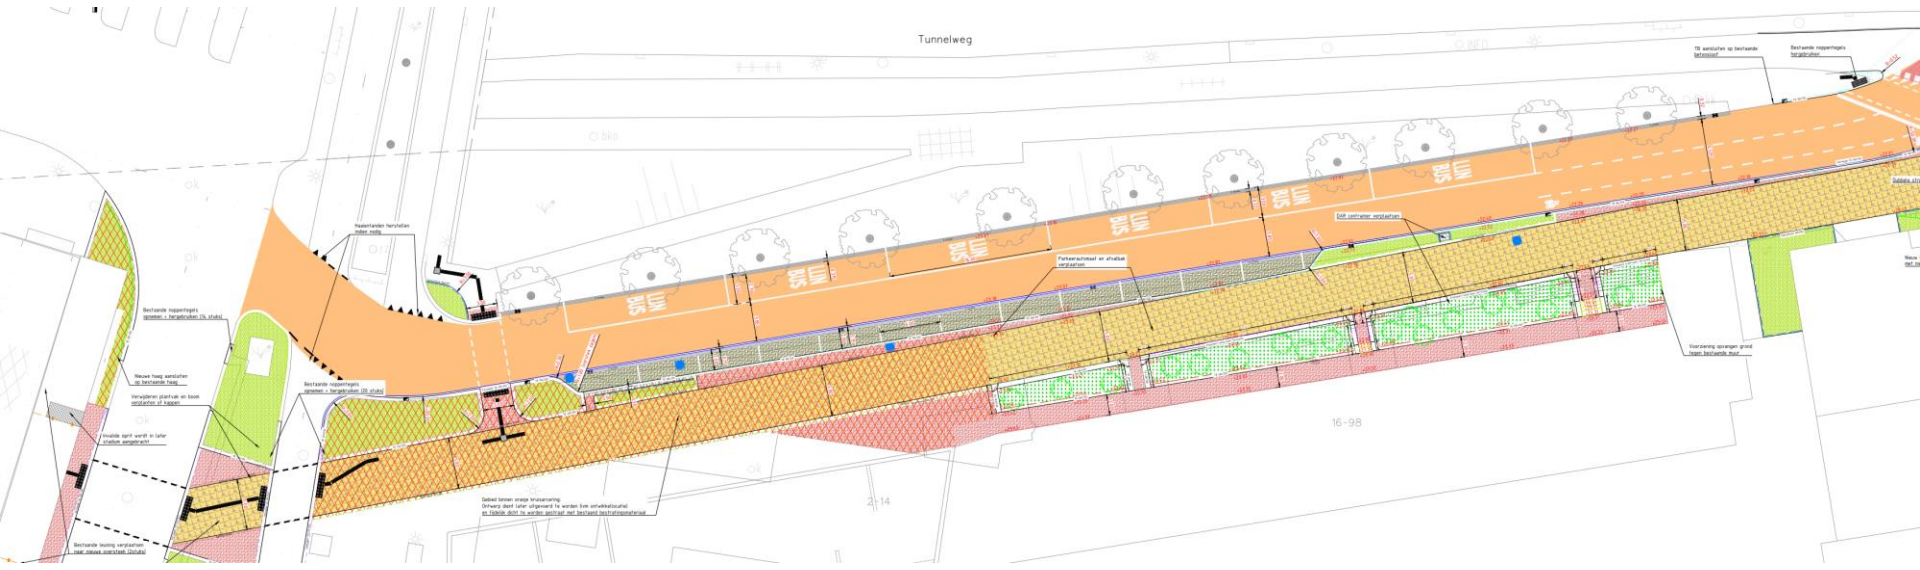




RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

# Zitbankelementen Burg. Hustinxstraat

---

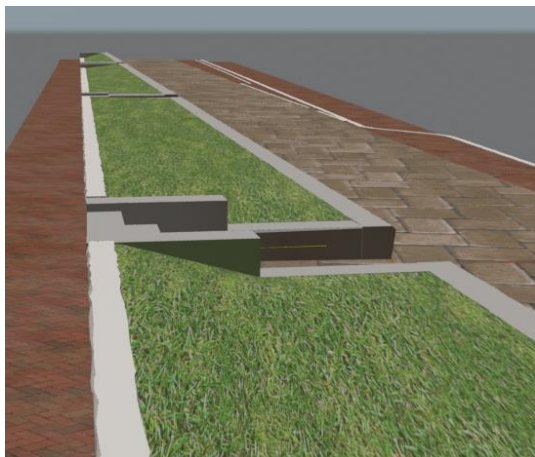

RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

# Planning en fasering

---



## Volledige afsluiting

---

- Werkvak wordt volledig afgesloten voor alle verkeer;
- Keuze gebaseerd op veiligheid en bouwtijd;
- Busvervoer wordt in overleg met Breng omgeleid (omleiding wordt later toegelicht)
- Middels bouw- en dranghekken worden voetgangers en fietsers van het werkvak geweerd.
- Aanliggende bedrijven / percelen blijven te voet bereikbaar (exacte maatregel wordt later toegelicht)




## Planning & Fasering

- Start Burg. Hustinxstraat: Maandag 23 juli 2018, 07:00 uur

---

- Start volledige afsluiting: Woensdag 25 juli 2018, 07:00 uur
- Uiterlijke openstelling Quackplein: Maandag 13 augustus 2018, 05:00 uur
- Afbouwwerkzaamheden: Vanaf 13 augustus 2018

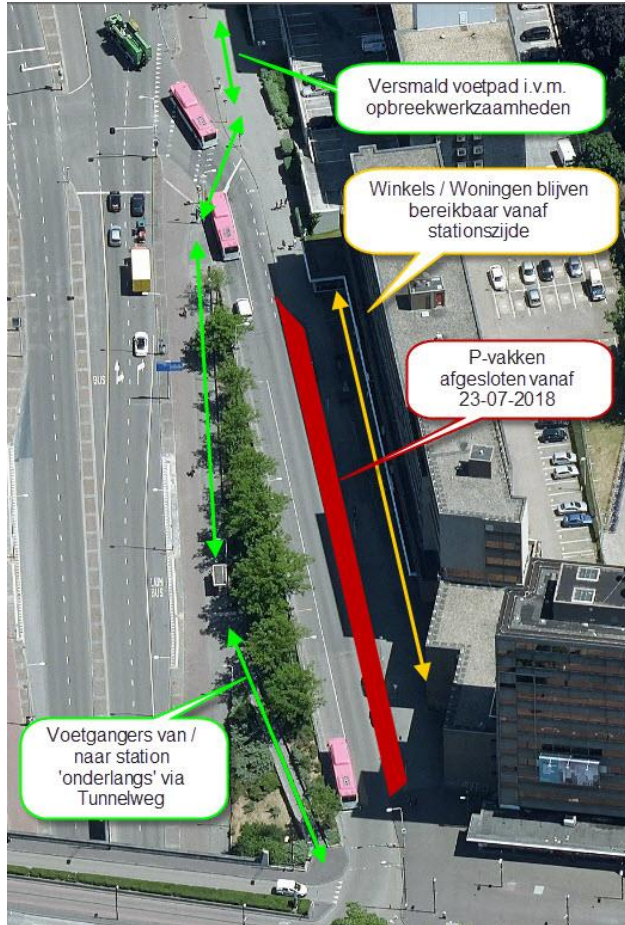

RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

# Burg. Hustinxstraat

- Voetgangers van/naar station moeten tijdens werktijden 'onderlangs' via Tunnelweg
- Parkeervakken afgesloten vanaf maandag 23 juli 2018
- Winkels/woningen blijven bereikbaar vanaf stationszijde (gelijk aan de gehele afsluiting)

RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT


# Toelichting Bereikbaarheid

---

- Maatregelen busvervoer
- Bereikbaarheid percelen

# Maatregelen busvervoer

- Bussen worden volledig omgeleid;
- Busvervoer vanaf het station via v. Oldenbarneveldstraat
- Busvervoer naar het station via Arend Noorduijnstraat
- Tunnelweg wordt gebruikt als tijdelijke alternatieve parkeergelegenheid voor bussen
- Burg. Hustinxstraat volledig afgesloten
- Spoorstraat wordt ingericht voor 2 richtingen

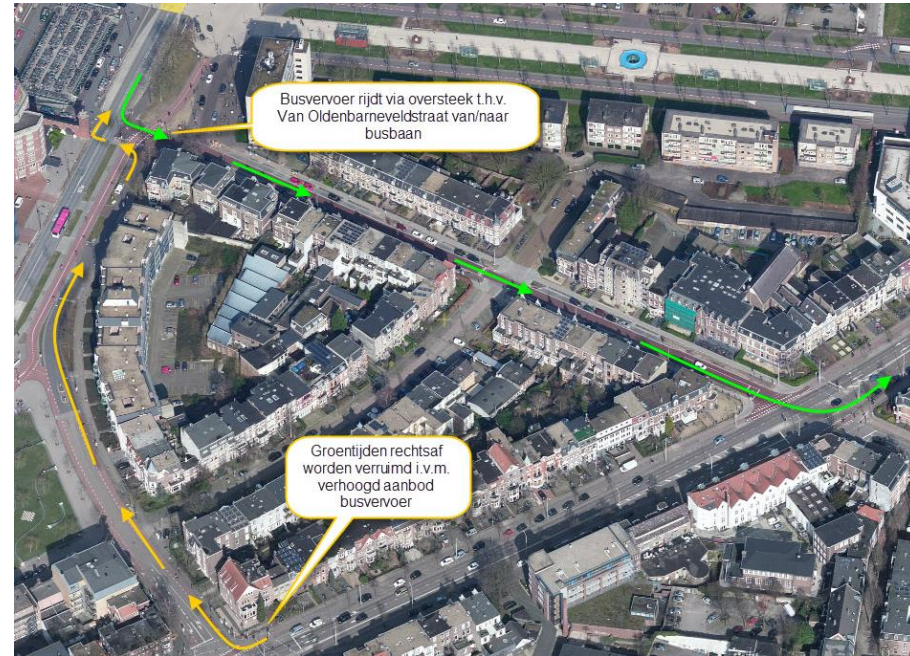

# Spoorstraat


- Alternatieve parkeerplaats busvervoer op Tunnelweg;
- Spoorstraat wordt tijdelijk 2 richtingen.
- Parkeergarage blijft bereikbaar via Smetiusstraat
- Tunnelweg enkel open voor busvervoer en hulpdiensten






# Burgemeester Hustinxstraat

- Auto's p-garage kunnen parkeren in Keizer Karel garage;
- Burg. Hustinxstraat volledig afgesloten;
- Bedrijven/woningen enkel bereikbaar vanaf stationszijde.

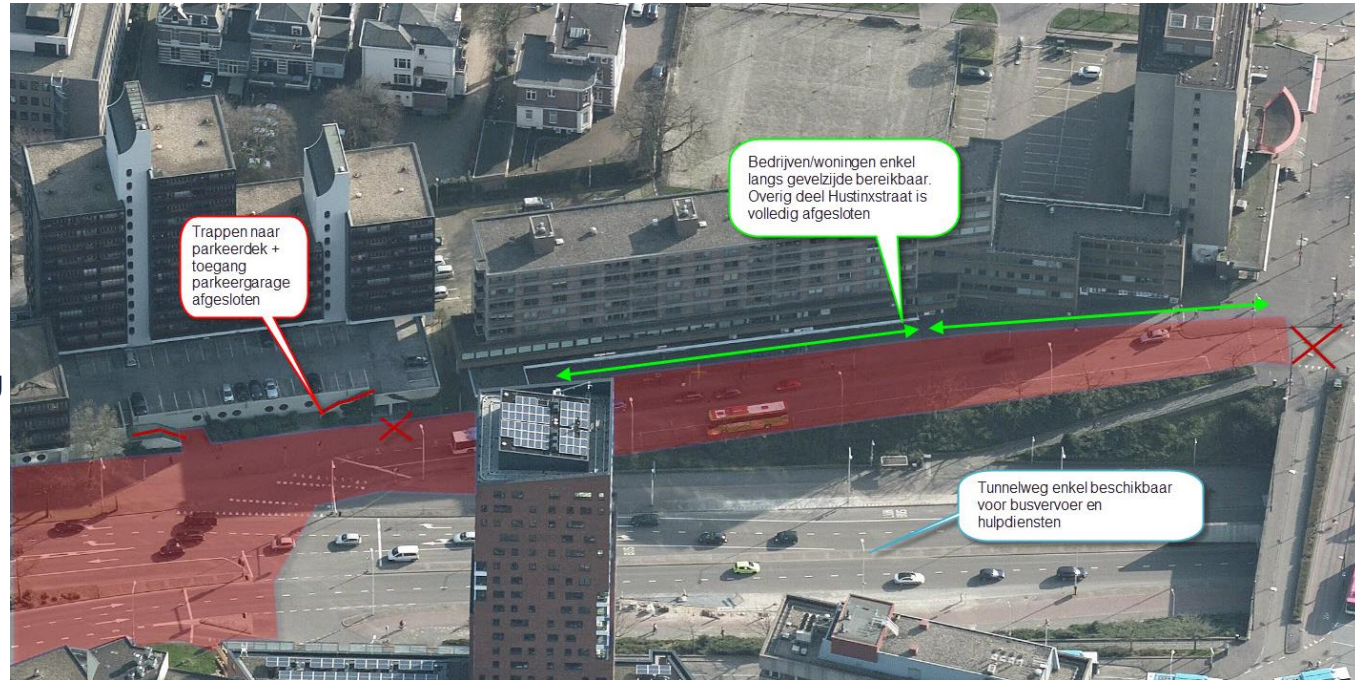

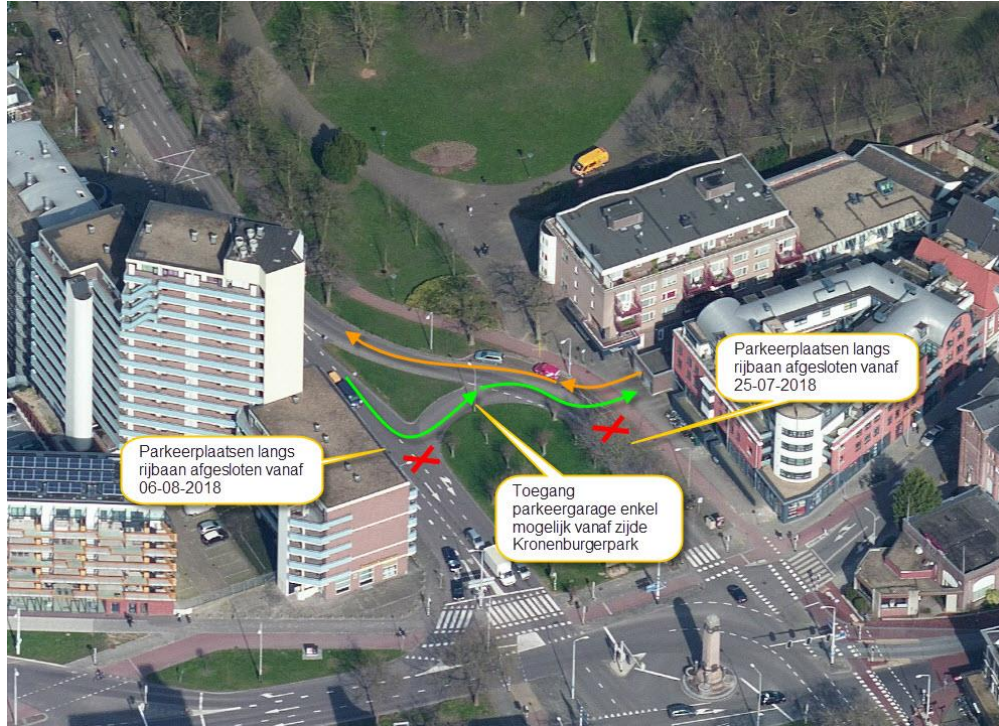


# Kronenburgersingel

- Oostpoot Nassausingel openstellen voor bestemmingsverkeer middels toegangspas
- Westpoot Nassausingel in 2 richtingen openstellen voor Schouburg + parkeergarage/dek

RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

# Bereikbaarheid Nassausingel

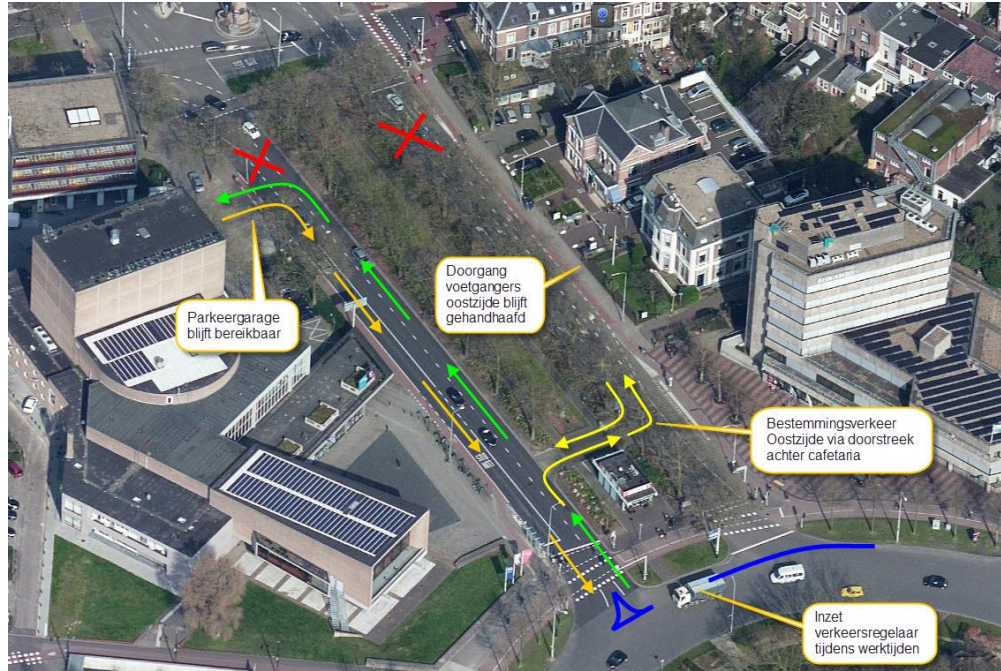

- Oostpoot Nassausingel is beschikbaar voor bestemmingsverkeer middels toegangspas (doorgang via doorsteek achter cafetaria)
- Westpoot Nassausingel in 2 richtingen beschikbaar voor Schouwburg + Guesthouse Vertoef & parkeergarage/dek Nassau Staete

RECONSTRUCTIE QUACKPLEIN EN BURGEMEESTER HUSTINXSTRAAT

## Vragen?

---

Bedankt voor uw aandacht en wij nodigen u graag uit bij één van de informatietafels.

Tijdens de uitvoeringsfase kunt u voor vragen/opmerkingen terecht in de keet of mailen naar: [Quackplein@heijmans.nl](mailto:Quackplein@heijmans.nl)



**heijmans**

 heijmansnl

 @heijmansnl

 heijmans

 heijmansnl
