Auteur: M. Leus
Versie: 7.0
Datum: 11-09-2024
Status: AANPASSING I.V.M. HOOGWATER / ONTLASTCONSTRUCTIE

REALISATIE 3 BRUGGEN
STELT ZUID - NIJMEGEN
- 2023-00300 -

AANNEMINGSBEDRIJF PLATENKAMP BORNE

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**REALISATIE 3 BRUGGEN DE STELT ZUID**	**298 dagen**	**maa 2-10-23**	**vri 17-1-25**
2				
3	**Documentenplanning / overige**	**65 dagen**	**maa 13-11-23**	**vri 23-2-24**
12				
13	**Overlegstructuur + verslaglegging (W101.03)**	**193 dagen**	**woe 6-12-23**	**din 15-10-24**
24				
25	**Engineering ontwerp + overige**	**162 dagen**	**maa 2-10-23**	**din 4-6-24**
46				
47	**Werkzaamheden op locatie:**	**208 dagen**	**maa 19-2-24**	**vri 17-1-25**
48	Maken bouwkundige opnames alle woningen	1 wk	maa 19-2-24	vri 23-2-24
49	Fotografische voor-opname (W201.01)	1 dag	maa 3-6-24	maa 3-6-24
50	**Fietsbrug 2 en Verkeersbrug 3**	**81 dagen**	**maa 3-6-24**	**woe 16-10-24**
51	**Betonwerk onderbouw**	**25 dagen**	**maa 3-6-24**	**vri 5-7-24**
61	**Grondwerkzaamheden Verkeers+ fietsbrug**	**5 dagen**	**maa 8-7-24**	**vri 12-7-24**
67				
68	**Betonwerk bovenbouw - beide bruggen gecombineerd**	**51 dagen**	**maa 15-7-24**	**woe 16-10-24**
69	VERKEERSMAATREGELEN AFDRAAIEN EN BOUW OPRUIMEN	1 dag	maa 15-7-24	maa 15-7-24
70	NIJMEEGSE 4-DAAGSE	4 dagen	din 16-7-24	vri 19-7-24
71	VERKEERSMAATREGELEN WEER TOEPASSEN	1 dag	maa 22-7-24	maa 22-7-24
72	Maken opstelplateaus telekraan	1 dag	maa 22-7-24	maa 22-7-24
73	Leggen liggers beide bruggen	1 dag	din 23-7-24	din 23-7-24
74	Maken ondersteuningsconstructie t.b.v. brugranden	4 dagen	woe 24-7-24	maa 29-7-24
75	Aanbr. Wap. / mantelbuizen + storten brugdekken brug 2&3 - 1e&2e laag	9 dagen	vri 26-7-24	vri 30-8-24
76	Uitharding brugranden verkeersbrug	3 vwkn	vri 30-8-24	vri 20-9-24
77	Uitharding brugranden fietsbrug	3 vwkn	vri 30-8-24	vri 20-9-24
78	Aanbrengen betonbanden op dek	2 dagen	din 3-9-24	woe 4-9-24
79	Aanbrengen Stencilprint verkeersbrug	1 dag	don 5-9-24	don 5-9-24
80	Aanbrengen Stencilprint fietsbrug	1 dag	vri 6-9-24	vri 6-9-24
81	Ontkisten zijkanten bruggen	2 dagen	vri 6-9-24	maa 9-9-24
82	Aanbrengen metselwerk incl. rollagen verkeersbrug	8 dagen	maa 9-9-24	woe 18-9-24
83	Aanbrengen metselwerk incl. rollagen fietsbrug	1 wk	don 19-9-24	woe 25-9-24
84	Aanbr. Brugleuningen incl. ondersabelen - verkeersbrug	3 dagen	maa 23-9-24	woe 25-9-24
85	Aanbr. Brugleuningen incl. ondersabelen - fietsbrug	2 dagen	don 26-9-24	vri 27-9-24
86	Verwijderen ondersteuningsconstructies	4 dagen	maa 30-9-24	don 3-10-24
87	Grondwerk t.b.v. stootplaten + leggen stootplaten	2 dagen	don 3-10-24	vri 4-10-24
88	Def. Grondwerk / Aanbr. Asfaltverh. + straatwerk aansl. Naar bestaand - wijkzijde	1 wk	din 1-10-24	maa 7-10-24
89	WERKZMH. HEIJMANS - DEF. ASFALT TURENNESINGEL ZIJDE	1 wk	din 8-10-24	maa 14-10-24
90	Afrondende werkzaamheden / opruimen / openstelling bruggen	2 dagen	maa 14-10-24	din 15-10-24
91	Fotografische na-opname	1 dag	din 15-10-24	din 15-10-24
92	Openstelling brug 2 en 3	1 dag	woe 16-10-24	woe 16-10-24
93				
94	**Ontlastconstructie Verkeersbrug 1&2 en fietsbrug 3**	**14 dagen**	**maa 16-9-24**	**don 3-10-24**
95	Plaatsen extra TVM bij brug 1	1 dag	maa 16-9-24	maa 16-9-24
96	Aanbrengen dammen en plaatsen pomp	1 dag	maa 16-9-24	maa 16-9-24
97	Looptijd bemaling	7 dagen	din 17-9-24	woe 25-9-24
98	Ontgraven / Aanbr. Keerwanden / ontlastconstructie en aanv. Achterz. Tot +9.100 - 2&3	4 dagen	din 17-9-24	vri 20-9-24
99	Ontgraven / Aanbr. Keerwanden / ontlastconstructie en aanv. Achterz. Tot +9.100 - 1	3 dagen	maa 23-9-24	woe 25-9-24
100	Aanbr. Schanskorf - ca 23m1 * 220cmh - 2&3	5 dagen	maa 23-9-24	vri 27-9-24
101	Aanbr. Schanskorf - ca 3,5m1 * 220cmh - 1	3 dagen	maa 30-9-24	woe 2-10-24
102	Verwijderen bemaling	1 dag	don 3-10-24	don 3-10-24
103				
104	**Verkeersbrug 1**	**57 dagen**	**don 17-10-24**	**vri 17-1-25**
105	**Betonwerk onderbouw**	**15 dagen**	**don 17-10-24**	**woe 6-11-24**
106	Maken bouwplaatsinrichting, plaatsen hekken/rijplaten/omleiding fietsers etc.	1 dag	don 17-10-24	don 17-10-24
107	Verwijderen bebordingen/bestrating/ ontgraven sleuven t.b.v. heipalen	2 dagen	don 17-10-24	vri 18-10-24
108	Aanbr. Heipalen 10st verkeersbrug incl. tijd. Voorzieningen	2 dagen	maa 21-10-24	din 22-10-24
109	Ontgraven sleuf t.b.v. bouw landhoofd	1 dag	woe 23-10-24	woe 23-10-24
110	Aanbrengen betonnen damplanken	2 dagen	don 24-10-24	vri 25-10-24
111	Aanbrengen werkvloeren	1 dag	maa 28-10-24	maa 28-10-24
112	Koppen snellen heipalen	2 dagen	din 29-10-24	woe 30-10-24
113	Aanbrengen landhoofden	5 dagen	don 31-10-24	woe 6-11-24
114	**Grondwerkzaamheden Verkeersbrug 1**	**5 dagen**	**don 7-11-24**	**woe 13-11-24**
115	Ontgraven best. Dam - def. Grw onder brug	2 dagen	don 7-11-24	vri 8-11-24
116	Aanbr. Hoeklijn tbv schanskorf aan keerwand	0,5 dagen	vri 8-11-24	vri 8-11-24
117	Aanbrengen blokkenmatten	1 dag	maa 11-11-24	maa 11-11-24
118	Aanbr schanskorf onder de brug - ca 8m1 * 1,5m1	2 dagen	din 12-11-24	woe 13-11-24
119	**Betonwerk bovenbouw verkeersbrug 1**	**32 dagen**	**don 14-11-24**	**vri 10-1-25**
120	Maken opstelplateau telekraan	1 dag	don 14-11-24	don 14-11-24
121	Leggen liggers verkeersbrug 1	1 dag	vri 15-11-24	vri 15-11-24
122	Maken ondersteuningsconstructie t.b.v. brugranden	2 dagen	vri 15-11-24	maa 18-11-24
123	Aanbr. Wap. / mantelbuizen + dichtz. 1e stortfase + storten beton 1e laag	4 dagen	din 19-11-24	vri 22-11-24
124	Aanbr. Zijkant + schamprandbekisting + wap. En storten dek in toog verkeersbrug	5 dagen	maa 25-11-24	vri 29-11-24
125	Uitharding brugdek	3,04 vwkn	vri 29-11-24	vri 20-12-24
126	Aanbrengen betonbanden op dek	1 dag	maa 2-12-24	maa 2-12-24
127	Aanbrengen Stencilprint verkeersbrug	1 dag	din 3-12-24	din 3-12-24
128	Ontkisten zijkanten brug	2 dagen	woe 4-12-24	don 5-12-24
129	Aanbrengen metselwerk incl. rollagen verkeersbrug	8 dagen	maa 9-12-24	woe 18-12-24
130	Aanbr. Brugleuningen incl. ondersabelen	3 dagen	woe 18-12-24	vri 20-12-24
131	Grondwerk t.b.v. stootplaten + leggen stootplaten	1 dag	maa 9-12-24	maa 9-12-24
132	Def. Grondwerk / Aanbr. Asfaltverh. + straatwerk aansl. naar bestaand	4 dagen	din 10-12-24	vri 13-12-24
133	Verwijderen ondersteuningsconstructies	2 dagen	maa 6-1-25	din 7-1-25
134	Afrondende werkzaamheden / opruimen / openstelling brug	2 dagen	woe 8-1-25	don 9-1-25
135	Fotografische na-opname	1 dag	vri 10-1-25	vri 10-1-25
136	Buffer	1 wk	maa 13-1-25	vri 17-1-25
137	Oplevering gehele werk	1 dag	vri 17-1-25	vri 17-1-25
138				
139	**Gemeente Nijmegen**	1 wk	maa 16-9-24	vri 20-9-24
140	**Aannemingsbedrijf Platenkamp BV**	1 wk	maa 16-9-24	vri 20-9-24
141	**Nepocon**	1 wk	maa 16-9-24	vri 20-9-24
142	**NTP**	1 wk	maa 16-9-24	vri 20-9-24
143	**Van Dieren**	1 wk	maa 16-9-24	vri 20-9-24
144	**Ecobasic**	1 wk	maa 16-9-24	vri 20-9-24

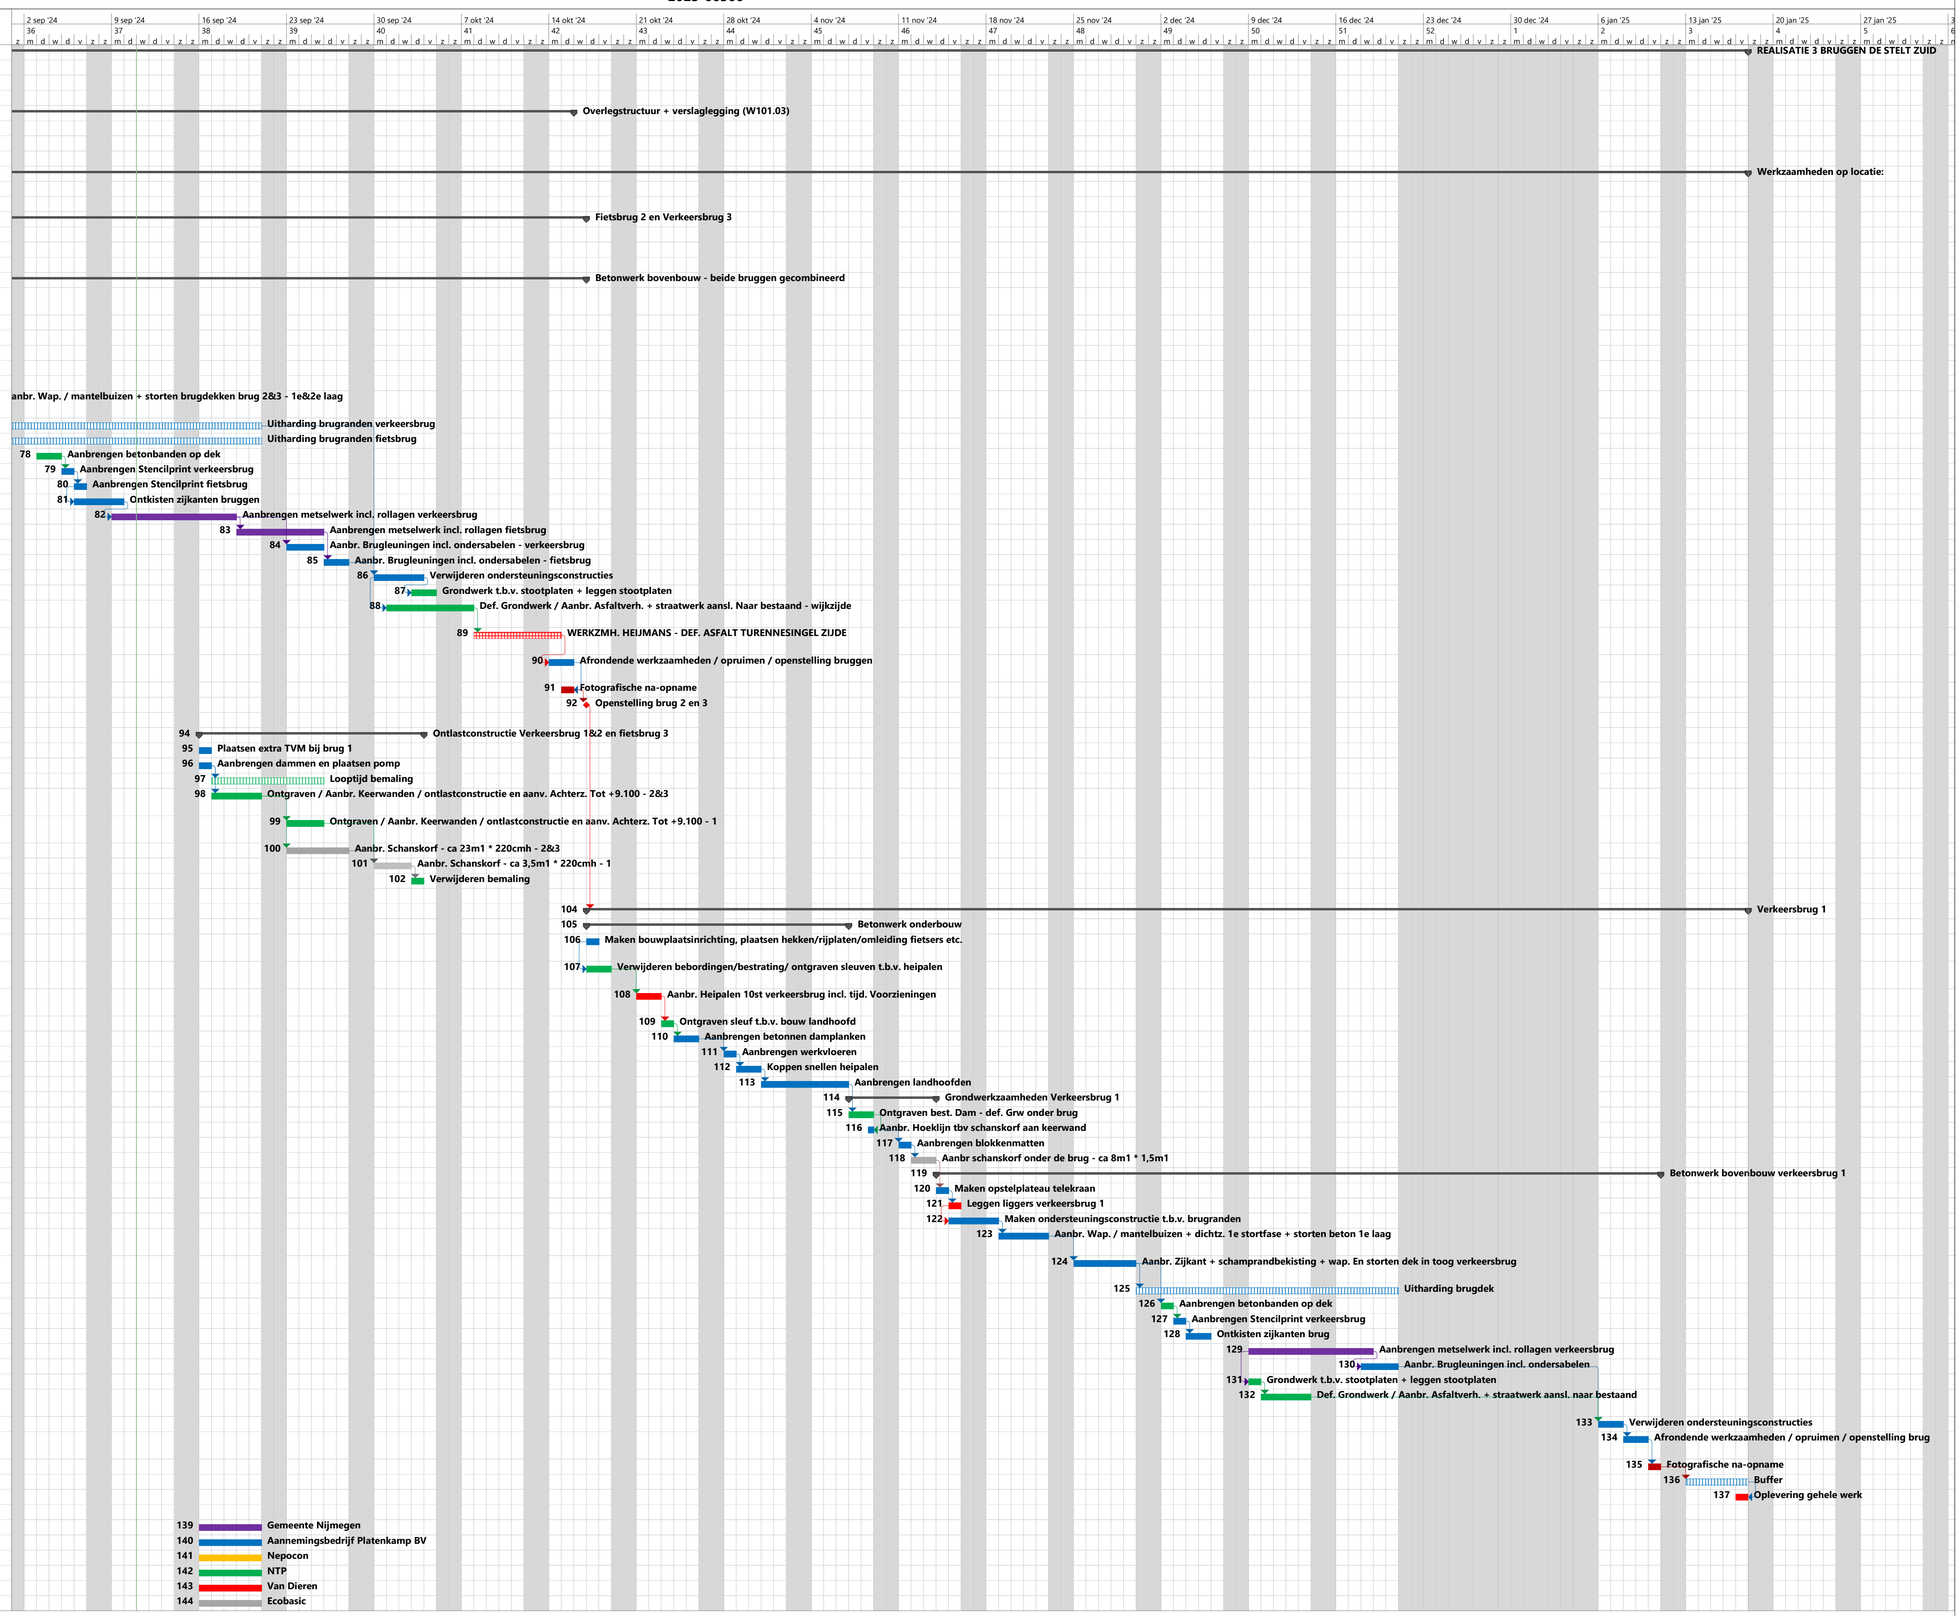

Project: 2023-00300-PLA-Nijme
Datum: woe 11-9-24

Taak | Mijlpaal | Projectsamenvatting | Inactieve mijlpaal | Handmatig taak | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Externe taken | Deadline | Voortgang, handmatig
Splitsing | Samenvatting | Inactieve taken | Inactieve samenvatting | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Alleen einddatum | Externe mijlpaal | Voortgang
