Planning

Datum: 07-11-2019
Versie: 5

GMB Rioleringstechnieken BV
Postbus 373
8260 AJ Kampen

T (088) 885 54 200
F
I www.gmb.eu
E info@gmb.eu

project: SRNC-uitvoeringsplanning
projectnr.: 2200-66555
opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
onderwerp: Planning uitvoering
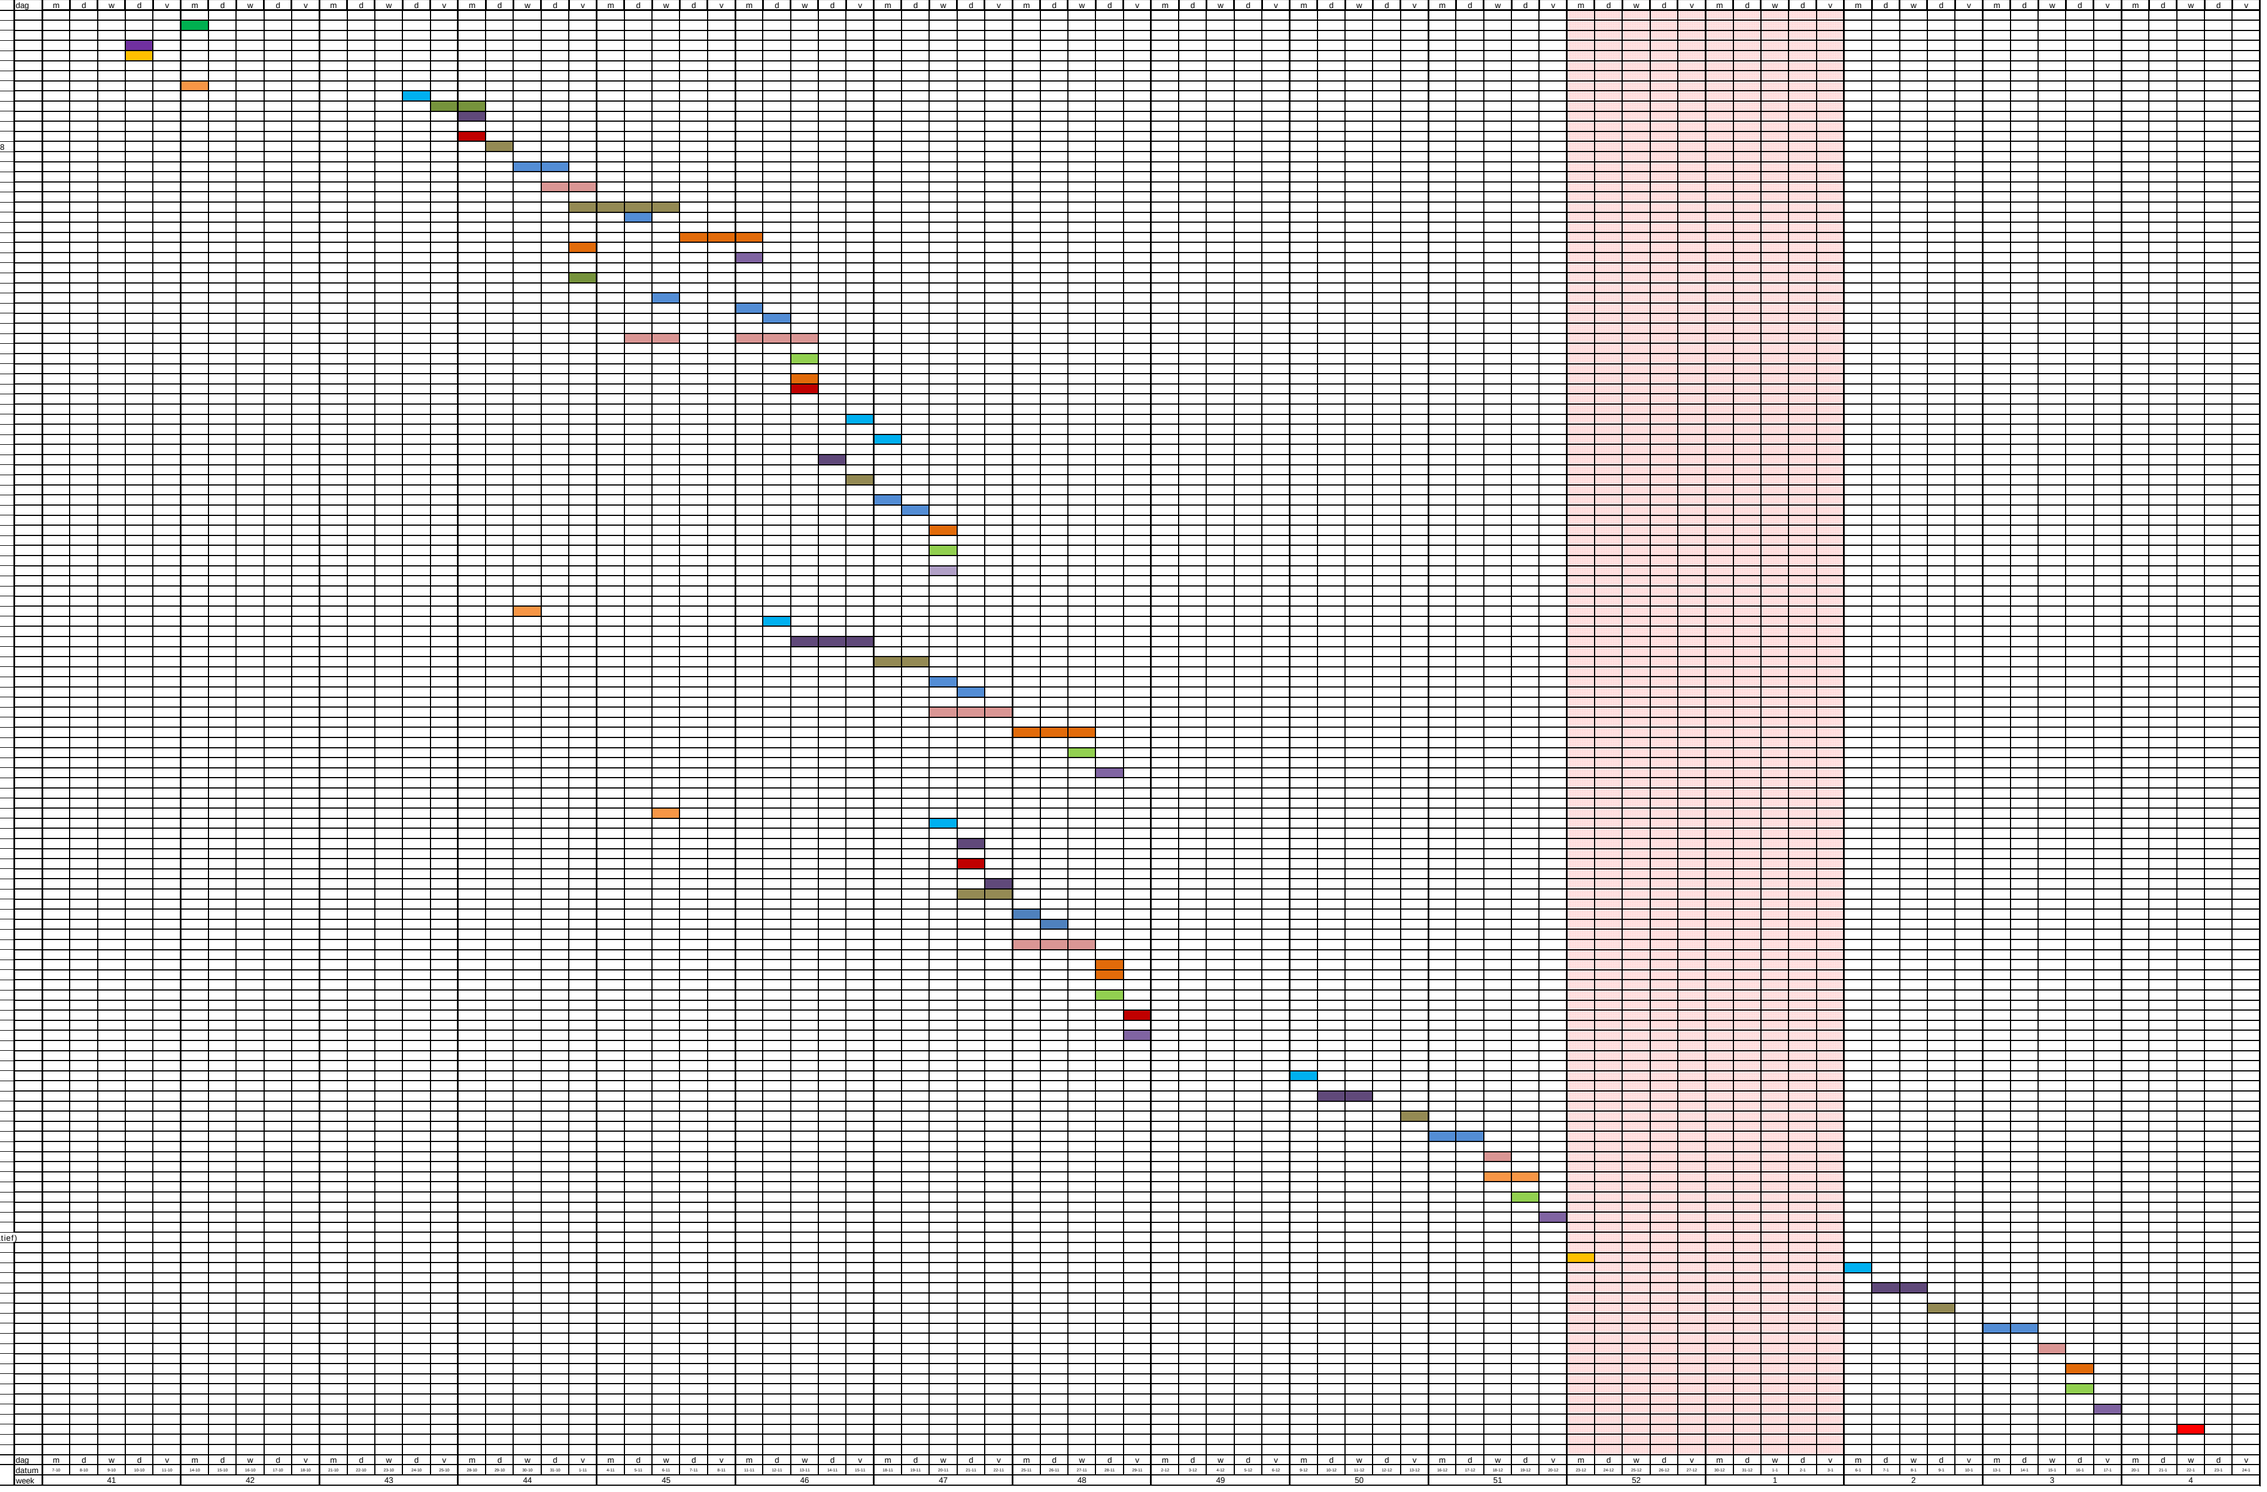
Setnr.	Nr.	Omschrijving
		Opdrachtverlening
		Bespreken VKM gemeente Nijmegen
		Bespreken Klic-meldingen Liander
		LOCATIE MOLENSTRAAT
		Plaatsen vooraankondiging VKM Burg Hamerstraat
		Plaatsen VKM Burg Hamerstraat incl. omleiding
		Vrijgraven/ slopen put 13147
		Opgraven inlaten 13147 > 13148
		Plaatsen afsluiter put 2686 St. Annastraat
		Verwijderen obstakels/ inmeten inlaten 13147> 13148
		Relining Naaldvilt 13147 > 13148
		Afwerken liner 13147 > 13148 incl. openen inlaten
		Verwijderen obstakels/ inmeten inlaten
		Relining GVK 2062 > 2061
		Herstellen put 13147
		Herstellen inlaten 13147 > 13148
		Verwijderen VKM Burg Hamerstraat
		Vrijgraven put 2062 incl. verwijderen putplaat
		Relining GVK 2654 > 13147
		Relining GVK 2061 > 2060
		Relining GVK 2060 > 13148
		Openen en Afwerken inlaten
		Opleveringsinspectie Molenstraat
		Herstellen put 2062
		Verwijderen afsluiter put 2686 St. Annastraat
		LOCATIE KRONENBURGERSINGEL
		Plaatsen VKM Veemarkt
		Plaatsen VKM Kronenburgersingel
		Vrijgraven en slopen put 1630
		Verwijderen obstakels
		Relining GVK 1630 > 1589
		Relining GVK 1630 > 1633
		Herstellen put 1630
		Opleveringsinspectie Kronenburgersingel
		Verwijderen VKM Kronenburgersingel
		LOCATIE MUNTWEG
		Plaatsen vooraankondiging VKM Muntweg
		Plaatsen VKM Muntweg incl. omleiding
		Vrijgraven en slopen put 3517/3518
		Verwijderen obstakels/ inmeten inlaten
		Relining GVK 3519 > 3518
		Relining GVK 3517 > 4634
		Openen en afwerken inlaten
		Herstellen put 3517/3518
		Opleveringsinspectie Muntweg
		Verwijderen VKM Muntweg
		LOCATIE DODDENDAAL
		Plaatsen vooraankondiging VKM Doddendaal
		Plaatsen VKM Doddendaal incl. omleiding
		Verwijderen putkoppen put 2025 & 1659
		Sluiten schuif Plein 1944
		Opgraven aansluiting studentenhuis
		Verwijderen obstakels en inmeten inlaten
		Relining GVK 2025 > 2021
		Relining GVK 2021 > 1659
		Openen en afwerken inlaten
		Herplaatsen putkoppen
		Herstel aansluiting studentenhuis
		Opleveringsinspectie Doddendaal
		Openen schuif Plein 1944
		Verwijderen VKM Doddendaal
		LOCATIE GRAAFSEWEG
		Plaatsen VKM Graafseweg (geen omleiding)
		Vrijgraven put 2497 (incl. taludbescherming)
		Verwijderen obstakels
		Relining Naaldvilt 2501>2497
		Afwerken liner 2501 > 2497
		Herstellen put 2497 incl. talud
		Opleveringsinspectie Graafseweg
		Verwijderen VKM Graafseweg
		LOCATIE VD BRUGGHENSTRAAT (Datum indicatief)
		Plaatsen vooraankondiging VKM vd Brugghenstraat
		Plaatsen VKM vd Brugghenstraat
		Vrijgraven en slopen put 2761
		Obstakels verwijderen en inlaten inmeten
		Relining Naaldvilt 2761 > 13149
		Afwerken liner 2761 > 13149, incl. openen inlaten
		Herstellen put 2761
		Opleveringsinspectie vd Brugghenstraat
		Verwijderen VKM vd Brugghenstraat
		Aanleveren inspectierapportage
